

IZVJEŠĆE O RADU REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM ŠAGULJE d.o.o. ZA 2022. GODINU



Slavonski Brod, ožujak 2023.

KLASA: 400-05/23-01/01
URBROJ: 2178/01-33-23-01

Sadržaj

1. UVOD	4
1.1. OPIS DJELATNOSTI	5
1.2. OSNOVNI PODATCI O FINANCIRANJU PROJEKTA	6
1.3. VIZIJA I MISIJA DRUŠTVA	7
2. PROVEDENE AKTIVNOSTI U 2022. GODINI	8
2.1. Pregled aktivnosti vezanih uz izradu studijsko-projektne dokumentacije tijekom 2022. godine	8
2.1.1. Izvršene aktivnosti i predana dokumentacija Naručitelju za Grupu 1	8
2.1.2. Izvršene aktivnosti i predana dokumentacija Naručitelju za Grupu 2	9
2.1.3. Izvršene aktivnosti i predana dokumentacija Naručitelju za Grupu 3	11
2.2. Pregled aktivnosti promidžbe i vidljivosti Projekta izrade studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Šagulje	11
2.3. Ostale aktivnosti	12
3. OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTATI U 2022. GODINI	19
3.1. Stanje imovine	19
3.2. Financijski rezultati u 2022. godini	20
4. ZAKLJUČAK	21

POPIS KRATICA:

Kratika:	Značenje:
RCGO	Regionalni centar za gospodarenje otpadom
NKD	Nacionalna klasifikacija djelatnosti
NN	Narodne novine
RH	Republika Hrvatska
CGO	Centar za gospodarenje otpadom
PDV	Porez na dodanu vrijednost
BPŽ	Brodsko-posavska županija
PSŽ	Požeško-slavonska županija
SMŽ	Sisačko-moslavačka županija
VPŽ	Virovitičko-podravska županija
MINGOR	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
EU	Europska unija
EK	Europska komisija

1. UVOD

Trgovačko društvo **REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM ŠAGULJE d.o.o.** je regionalna komunalna tvrtka (u daljnjem tekstu: Društvo, RCGO) osnovana 08. studenog 2017. godine sa sjedištem u Slavanskom Brodu, s ciljem da organizira izgradnju te potom upravlja radom RCGO Šagulje u Novoj Gradiški. U vlasništvu je triju županija, i to: Brodsko-posavske (51%), Požeško-slavonske (24,5%) i Sisačko-moslavačke (24,5%).

Cilj osnivanja je uspostava sustava gospodarenja otpadom Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije, a sukladno Strategiji i Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.


Osoba ovlaštena za zastupanje društva je predsjednik Uprave Josip Grgić, dipl.ing.stroj.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Obuhvat samog projekta prostire se na tri županije, i to: dio Sisačko-moslavačke, Požeško-slavonsku i Brodsko-posavsku županiju. Izmjenom Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. pridružena je Virovitičko-podravska županija, a isto utječe na:

- Povećanje količine komunalnog otpada od 23.140 t/g
- Povećanje broja stanovnika koji će gravitirati centru za 70.660

Slika 1: Obuhvat RCGO Šagulje

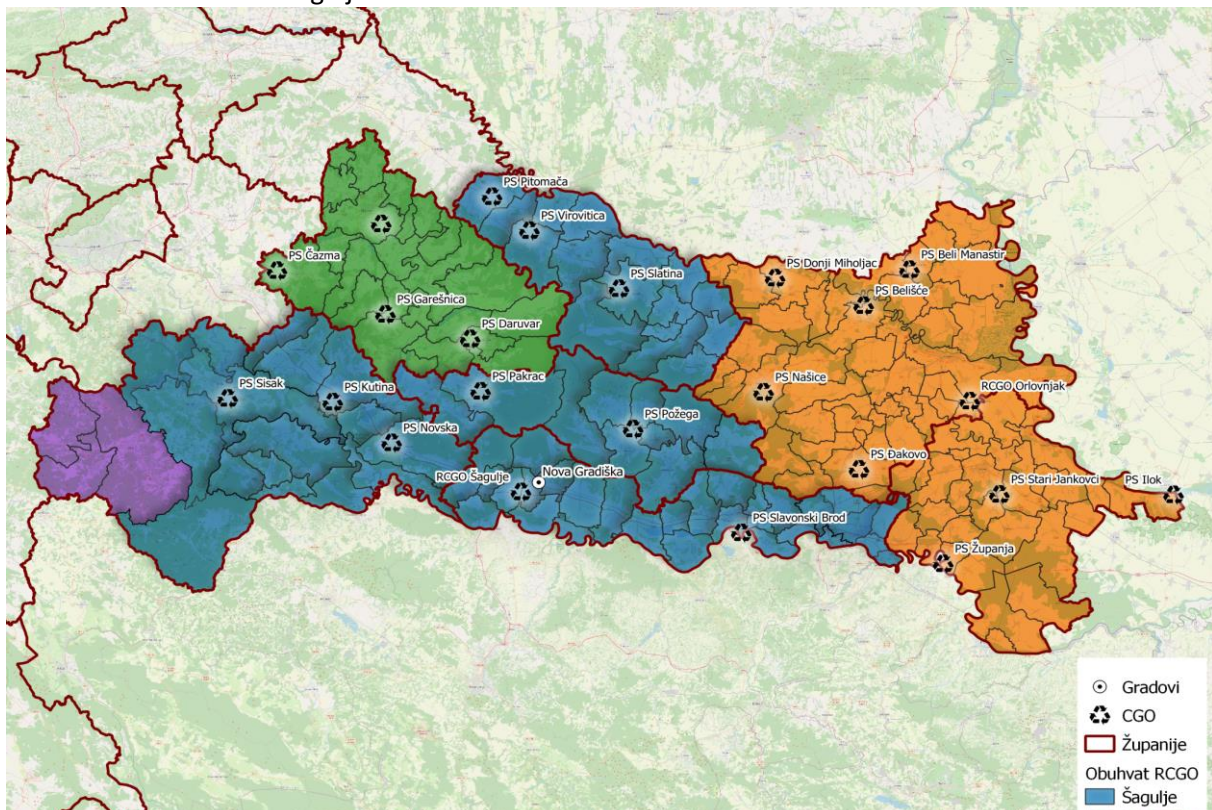

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, prema RCGO Šagulje gravitirat će **477.071 stanovnik.**

1.1. Opis djelatnosti

Osnovna djelatnost RCGO Šagulje d.o.o. je, prema NKD klasifikaciji, gospodarenje otpadom.

Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj, Sisačko-moslavačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji osnovu nalazi u Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021), u Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) za razdoblje 2005. do 2025. i u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017.-2022. (NN 3/2017, 1/2022).

Slika 2: Prikaz kružnog gospodarstva s pregledom nadležnosti u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom



Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje zajedno sa pretovarnim stanicama predstavlja važan dio tog sustava koji se mora uspostaviti na regionalnoj razini, a koja će uspostava doprinijeti ispunjenju ciljeva iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6.1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, Plana gospodarenja otpadom RH 2017.2022. i Zakona o gospodarenju otpadom, na razini RH.

Centar za gospodarenje otpadom je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada, te je kao takav građevina za gospodarenje otpadom od državnog značaja prema članku 12. stavku 1. Zakona o gospodarenju otpadom.

Pretovarna stanica je građevina za privremeno skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove uporabe ili zbrinjavanja, odnosno u CGO.

Projekt obuhvaća ulaganje u izgradnju RCGO na lokaciji Šagulje, na području grada Nova Gradiška, izgradnju pretovarnih stanica te nabavku opreme potrebne za rad istih.

Razvoj Projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje podijeljen je u tri faze:

- Pripremna faza: priprema studijske i projektno-tehničke dokumentacije, provođenje upravnih postupaka pri nadležnim tijelima, ishođenje svih potrebnih administrativnih rješenja, lokacijskih dozvola, a sve u svrhu osiguranja sredstava za sufinanciranje Projekta RCGO Šagulje sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
- Provedbena faza: provedba postupaka javne nabave, ugovaranje, izvršavanje ugovora sklopljenih po provedenim postupcima, informiranje i edukacija stanovništva s obuhvata RCGO Šagulje o cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.
- Operativna faza: upravljanje izgrađenom infrastrukturom nakon preuzimanja Centra za gospodarenje otpadom i pretovarnih stanica.

1.2. Osnovni podatci o financiranju Projekta

Vrijednost projekta "Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o." iznosi 15.000.000,00 kuna.

Regionalni centar za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o. povukao je ukupno 14.700.000,00 kn (bez PDV-a) sredstava iz europskih fondova:

- Bespovratna sredstva za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Posrednička tijela su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.
Ugovorom, koji je potpisan 20. srpnja 2018., dodjeljena su bespovratna sredstva u iznosu od **12.750.000,00kn** (bez PDV-a) što predstavlja **85%** ukupno prihvatljivih troškova Projekta: **Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje**
- Ugovorom o sufinanciranju provedbe projekta „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“, davanjem kapitalne pomoći odobrena su sredstva u iznosu od **750.000,00kn** (bez PDV-a), što čini **5%** procijenjenih i opravdanih troškova predmetnog projekta „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“.
- Dana 31. srpnja. 2018. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisalo je „**Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu**“. RCGO Šagulje d.o.o. prijavilo se na Javni poziv te zadovoljilo sve kriterije propisane predmetnim pozivom za dodjelu sredstava Fonda te je odabran za sufinanciranje. Dana 16. listopada 2018. godine odobrena je dodjela bespovratnih sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu, u iznosu od **1.200.000,00 kn**. Sredstva su dodijeljena isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora u provedbi projekta „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“ koji se provodi na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju od 2014.-2020. Time je omogućeno da se cijeli Projekt financira iz bespovratnih sredstava EU/RH.

1.3. Vizija i misija Društva

Slika 3: Vizija i misija Društva



Vizija

Odgovorno upravljanje izgrađenom infrastrukturom za gospodarenje otpadom zasnovanom na najvišim standardima zaštite okoliša i ljudskog zdravlja i osiguravanje održivosti uspostavljenog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u BPŽ, PSŽ, SMŽ i VPŽ

Misija

Izgraditi infrastrukturu za gospodarenje otpadom na regionalnoj razini, centar za gospodarenje otpadom i pretovarne stanice. Osigurati da se gospodarenje otpadom primjenom najsuvremenijih tehnologija obrade otpada odvija uz maksimalnu zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja.

Osigurati pretpostavke da uspostavljeni sustav odgovara dugoročnim potrebama i mogućnostima stanovništva BPŽ, PSŽ, SMŽ i VPŽ te da jamči njegovu održivost.

Edukacijom dionika omogućiti postizanje ciljeva projekta. Upravljeti uspostavljenim sustavom na dobrobit današnjih i budućih generacija

2. PROVEDENE AKTIVNOSTI U 2022. GODINI

2.1. Pregled aktivnosti vezanih uz izradu studijsko-projektne dokumentacije tijekom 2022. godine

RCGO Šagulje d.o.o. u svojstvu Naručitelja ugovorilo je 01.10.2019. godine izradu cjelokupno potrebne studijsko-projektne dokumentacije projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje te pripadne infrastrukture, kroz 3 grupe nabave. Inicijalna postavka Projekta bilo je planirana prijava Projekta Šagulje na EU (su)financiranje putem operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, a sama izrada studijsko-projektne dokumentacije je također bila EU (su)financirani projekt.

2.1.1. Izvršene aktivnosti i predana dokumentacija Naručitelju za Grupu 1

- **Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi za RCGO Šagulje i pretovarne stanice**
Aktivnost 1. – Izvršena u potpunosti, nije dobiveno završno mišljenje JASPERS bez značajnih primjedbi
- **Idejno rješenje za RCGO Šagulje i prijedlog Idejnog rješenja tipske pretovarne stanice za potrebe Studije izvedivosti i za izradu Studije o utjecaju na okoliš**
Aktivnost 2. – Izvršena u potpunosti, nije dobiveno završno mišljenje JASPERS bez značajnih primjedbi
- **Studija utjecaja zahvata na okoliš**
Aktivnost 3. – Izvršena u potpunosti, 04. travnja 2022. ishođeno je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš
- **Dokumentacija potrebna za ishođenje lokacijske dozvole za RCGO**
Aktivnost 4. – Izvršena aktivnost 100%, Naručitelj potvrdio završeni Idejni projekt, ishođeni svi potrebni posebni uvjeti i uvjeti priključenja te je dana 16.01.2023. ishođena lokacijska dozvola.

Tijekom 2022. godine održano je pet sastanaka s JASPERS.

- 22. veljače 2022. godine
 - MBO postrojenja se neće financirati u novom programskom razdoblju
 - Moguće financiranje ukoliko se postrojenje izmjeni na način da prihvaća i obrađuje odvojeno prikupljeni otpad i biootpad
- 31. svibnja 2022. godine
 - Izmjene tokova otpada – prihvati odvojeno prikupljenog otpada i biootpada
 - Rješavanje problema s postojećim/budućim postrojenjima koja se bave obradom odvojeno prikupljenog otpada i biootpada, pitanjem ambalažnog otpada te pitanjem financiranja
- 13. srpanj 2022. godine
 - Dostava izmijenjenog idejnog rješenja, te uključuje Virovitičko-podravsku županiju zajedno s dodatnom pretovarnom stanicom u Virovitici
 - Daljnja rasprava o ambalažnom otpadu – neusuglašenost s Hrvatskim zakonima
- 21. rujna 2022. godine
 - Novi utjecaji na okoliš i daljnja rasprava o prihvatljivim tokovima otpada
- 15. studeni 2022. godine

- Pripremljena 4 scenarija tokova otpada – potvrda scenarija broj 2
- Stopa sufinanciranja još uvijek nepoznata

Tablica 1.: Vrijednost izvršenih usluga – Grupa 1:

	UKUPNO (kn)	PDV (kn)	SVEUKUPNO (kn)
Vrijednost ugovorenih radova	4.790.000,00	580.000,00	5.370.000,00
Ukupna vrijednost izvedenih radova zaključno sa 12/2022	3.800.600,00	499.300,00	4.299.900,00

Tablica 2.: Pregled financiranja Grupe 1:

Vrijednost izvedenih radova do 31.12.2022.	3.800.600,00
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 85% (MINGOR)	3.230.510,00
Ugovor o sufinanciranju u iznosu 5% (FZOEU)	190.030,00
Ugovor o sufinanciranju (MRRFEU)	380.060,00

2.1.2. Izvršene aktivnosti i predana dokumentacija Naručitelju za Grupu 2

PS SLAVONSKI BROD

- Izrađen geodetski projekt/elaborat
- Izrađen elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, te ishođeno Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš
- **Dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole**
Provedena prethodna geomehanička istraživanja, izrađen idejni projekt koncept, te razrađeni arhitektonski, građevinski, strojarski i elektrotehnički idejni projekti, ishođeni posebni uvjeti. Proveden je postupak parcelacije i predana je dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole.

PS POŽEGA

- Izrađen geodetski projekt/elaborat
- Izrađen elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, te ishođeno Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš
- **Dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole**
Provedena prethodna geomehanička istraživanja, izrađen idejni projekt koncept, te razrađeni arhitektonski, građevinski, strojarski i elektrotehnički idejni projekti, ishođeni posebni uvjeti. Pokrenut postupak za ishođenje lokacijske dozvole.
- **Dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole**
Provedena konačna geomehanička istraživanja.

PS PAKRAC

- Izrađen geodetski projekt/elaborat

- Izrađen elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, te ishođeno Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš
- **Dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole**
Provedena prethodna geomehanička istraživanja, izrađen idejni projekt koncept, te razrađeni arhitektonski, građevinski, strojarski i elektrotehnički idejni projekti, ishođeni posebni uvjeti. Ishođena lokacijska dozvola.
- **Dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole**
Provedena konačna geomehanička istraživanja.

PS NOVSKA

- Izrađen geodetski projekt/elaborat
- Izrađen elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, te ishođeno Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš.
- **Dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole**
Provedena prethodna geomehanička istraživanja, izrađen idejni projekt koncept, te razrađeni arhitektonski, građevinski, strojarski i elektrotehnički idejni projekti, ishođeni svi posebni uvjeti. Ishođena lokacijska dozvola.
- **Dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole**
Provedena konačna geomehanička istraživanja

PS KUTINA

- Izrađen geodetski projekt/elaborat
- Izrađen elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, te ishođeno Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš
- **Dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole**
Provedena prethodna geomehanička istraživanja, izrađen idejni projekt koncept, te razrađeni arhitektonski, građevinski, strojarski i elektrotehnički idejni projekti, ishođeni svi posebni uvjeti. Ishođena lokacijska dozvola. Pokrenut postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
- **Dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole**
Provedena konačna geomehanička istraživanja

PS SISAK

- Izrađen geodetski projekt/elaborat
- **Dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole**
Izrađena radna verzija idejnog projekta – koncepta
- **U ožujku 2023. godine očekuje se izmjena Prostornog plana uređenja grada Siska nakon kojeg slijedi nastavak izrade projektne dokumentacije za PS Sisak**

Tablica 3.: Vrijednost izvršenih usluga – Grupa 2:

	UKUPNO (kn)	PDV (kn)	SVEUKUPNO (kn)
Vrijednost ugovorenih radova	1.842.000,06	460.500,01	2.302.500,07
Ukupna vrijednost izvedenih radova zaključno sa 12/2022	592.995,25	32.576,75	625.572,00

Tablica 4.: Pregled financiranja Grupe 2:

Vrijednost izvedenih radova do 31.12.2022.	592.995,25
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 85% (MINGOR)	504.045,96
Ugovor o sufinanciranju u iznosu 5% (FZOEU)	29.649,76
Ugovor o sufinanciranju (MRRFEU)	59.299,52

2.1.3. Izvršene aktivnosti i predana dokumentacija Naručitelju za Grupu 3

Grupa 3 uvedena je u posao dana 27.05.2021. godine.

Do 31.12.2022. izrađena je i predana:

- radna verzija Dokumentacije o nabavi za pružanje usluga nadzora nad projektiranjem i izgradnjom RCGO Šagulje,
- radna verzija Dokumentacije o nabavi za usluge nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica u obuhvatu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje.
- Radna verzija Dokumentacije o nabavi za usluge upravljanja projektom
- Radna verzija Dokumentacije o nabavi za usluge promidžbe i vidljivosti projekta izgradnje RCGO Šagulje

Dokumentacija je pregledana te, uz korekcije, odobrena.

2.2. Pregled aktivnosti promidžbe i vidljivosti Projekta izrade studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Šagulje

Ova aktivnost također je financirana Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, u iznosu od 85%, ugovorom o sufinanciranju provedbe projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Šagulje davanjem kapitalne pomoći, u iznosu od 5% te Ugovorom o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, u preostalom iznosu.

Na temelju sklopljenog Ugovora, izvršitelji su uvedeni u posao dana 25. kolovoza 2021. godine.

U skladu s Ugovorom i Projektnim zadatkom te planiranim aktivnostima iz Terminskog/ Dinamičkog plana provedene su slijedeće aktivnosti:

Osmišljavanje, grafički dizajn, priprema za tisak i dostava promotivnih materijala:

- Plakat
- Info brošura
- Rolo baner
- USB memorija
- Reklamni eko mini notes s kemijskom olovkom i memo listovima

Medijska promidžba

- Izrada i oblikovanje materijala za objavu na web stranici projekta i društvenim mrežama te kontinuirano ažuriranje objavljenih informacija
- Zakup prostora na društvenim mrežama i Google platformama
- Zakup/emitiranje radio spota od 30 sec
- Zakup/emitiranje radijskog sadržaja
- Izrada/objava članka o projektu na prvom i drugom najposjećenijem lokalnom news portalu
- Dizajn, izrada i formatiranje web banner

Tablica 5.: Vrijednost izvršenih aktivnosti – Promidžba i vidljivost

	UKUPNO (kn)	PDV (kn)	SVEUKUPNO (kn)
Vrijednost ugovorenih radova	174.900,00	43.725,00	218.625,00
Ukupna vrijednost izvedenih radova zaključno sa 12/2022	72.200,00	18.050,00	90.250,00

Tablica 6.: Pregled financiranja promidžbe i vidljivosti:

Vrijednost izvršenih usluga do 31.12.2021.	72.200,00
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 85% (MINGOR)	61.370,00
Ugovor o sufinanciranju u iznosu 5% (FZOEU)	3.610,00
Ugovor o sufinanciranju (MRRFEU)	7.220,00

2.3.Ostale aktivnosti

Tijekom 2022. godine podneseno je sedam zahtjeva za nadoknadom sredstava Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i četiri zahtjeva za nadoknadom sredstava Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U nastavku se daje financijski pregled svih podnesenih zahtjeva.

Tijekom izvještajnog razdoblja, Projektni tim RCGO Šagulje sudjelovao je u radu Grupacije Centara za gospodarenje otpadom kroz davanje komentara na prijedloge izmjena zakonske regulative. Projektni tim također je surađivao s jedinicama lokalne samouprave u obuhvatu RCGO Šagulje prilikom izrade izmjena Prostornih planova istih.

U mjesecu kolovozu 2022. godine RCGO Šagulje se prijavilo na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije u vrijednosti 1.515.000 kn. Financiranje od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije iznosi 90%.

Ostvarenim sredstvima RCGO Šagulje će pripremiti projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju fotonaponske elektrane.

Projekt je pozitivno ocijenjen te će se s realizacijom istoga započeti u drugom kvartalu 2023. godine.

Tablica 7.: Financijski pregled projekta temeljem svih odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava do 31.12.2022.

Financijski pregled projekta

Obrazac	Financijski događaj	Datum odobrenja obrasca	Datum isplate / povrata	Odobreni prihvatljivi troškovi (HRK)	Odobreni iznos BS (HRK)	Privremeno odobreni prihvatljivi troškovi (HRK)	Privremeno odobreni iznos BS (HRK)	Iznos koji se smatra plaćenim (HRK)	Iznos za isplatu (HRK)	Iznos za povrat (HRK)	Isplaćeni iznos (HRK)	Vraćeni iznos (HRK)	Isplata / pravljanje predujma (HRK)
ZNS-01	ZNS-01 PTR - odobrenje	30.10.2018.		138.000,00	117.300,00								
ZPL-01	ZNS-01 PTR - odobrenje	31.10.2018.	22.11.2018.						117.300,00		117.300,00		
ZNS-02	ZNS-02 PTR - odobrenje	14.12.2018.		63.687,33	54.134,23								
ZPL-02	ZNS-02 PTR - odobrenje	14.12.2018.	24.12.2018.						54.134,23		54.134,23		
ZNS-03	ZNS-03 PTR - odobrenje	21.02.2019.		49.408,48	41.997,20								
ZPL-03	ZNS-03 PTR - odobrenje	21.02.2019.	01.03.2019.						41.997,20		41.997,20		
ZNS-04	ZNS-04 PTR - odobrenje	27.03.2019.		98.816,96	83.994,42								
ZPL-04	ZNS-04 PTR - odobrenje	27.03.2019.	03.04.2019.						83.994,42		83.994,42		
ZNS-05	ZNS-05 PTR - odobrenje	08.07.2019.		147.649,26	125.501,87								
ZPL-05	ZNS-05 PTR - odobrenje	08.07.2019.	17.07.2019.						125.501,87		125.501,87		
ZNS-06	ZNS-06 PTR - odobrenje	27.09.2019.		196.865,68	167.335,83								
ZPL-06	ZNS-06 PTR - odobrenje	27.09.2019.	07.10.2019.						167.335,83		167.335,83		
ZNS-07	ZNS-07 PTR - odobrenje	02.01.2020.		147.649,26	125.501,87								
ZPL-07	ZNS-07 PTR - odobrenje	02.01.2020.	14.01.2020.						125.501,87		125.501,87		
ZNS-08	ZNS-08 PTR - odobrenje	10.04.2020.		315.250,00	267.962,50								
ZPL-08	ZNS-08 PTR - odobrenje	10.04.2020.	24.04.2020.						267.962,50		267.962,50		
ZNS-09	ZNS-09 PTR - odobrenje	10.07.2020.		155.250,00	131.962,50								
ZPL-09	ZNS-09 PTR - odobrenje	10.07.2020.	20.07.2020.						131.962,50		131.962,50		
ZNS-10	ZNS-10 PTR - odobrenje	26.08.2020.		103.500,00	87.975,00								
ZPL-10	ZNS-10 PTR - odobrenje	27.08.2020.	04.09.2020.						87.975,00		87.975,00		
ZNS-11	ZNS-11 PTR - odobrenje	27.11.2020.		155.250,00	131.962,50								
ZPL-11	ZNS-11 PTR - odobrenje	27.11.2020.	04.12.2020.						131.962,50		131.962,50		
ZNS-12	ZNS-12 PTR - odobrenje; ZNS-12 NPT - privremeno odobrenje	17.12.2020.		51.750,00	43.987,50	1.284.000,00	1.091.400,00						
ZPL-12	ZNS-12 NPT - privremeno odobrenje; ZNS-12 PTR - odobrenje	17.12.2020.	11.01.2021.						1.135.387,50		1.135.387,50		
ZNS-12	ZNS-12 NPT - konačno odobrenje	01.03.2021.		1.284.000,00	1.091.400,00	- 1.284.000,00	- 1.091.400,00						
ZNS-13	ZNS-13 PTR - odobrenje	01.03.2021.		103.500,00	87.975,00								
ZPL-13	ZNS-13 PTR - odobrenje	02.03.2021.	10.03.2021.						87.975,00		87.975,00		

ZNS-14	ZNS-14 PTR - odobrenje	08.06.2021.		20.605,22	17.514,43							
ZPL-14	ZNS-14 PTR - odobrenje	08.06.2021.	21.06.2021.						17.514,43		17.514,43	
ZNS-15	ZNS-15 PTR - odobrenje; ZNS-15 NPT - privremeno odobrenje	29.07.2021.		13.736,81	11.676,29	118.919,64	101.081,69					
ZPL-15	ZNS-15 NPT - privremeno odobrenje; ZNS-15 PTR - odobrenje	29.07.2021.	26.08.2021.						112.757,98		112.757,98	
ZNS-15	ZNS-15 NPT - konačno odobrenje	16.09.2021.		118.919,64	101.081,69	- 118.919,64	- 101.081,69					
ZNS-16	ZNS-16 PTR - odobrenje; ZNS-16 NPT - privremeno odobrenje	27.10.2021.		13.736,81	11.676,29	33.446,15	28.429,23					
ZPL-16	ZNS-16 NPT - privremeno odobrenje; ZNS-16 PTR - odobrenje	27.10.2021.	15.11.2021.						40.105,51		40.105,51	
ZNS-16	ZNS-16 NPT - konačno odobrenje	22.11.2021.		33.446,15	28.429,23	- 33.446,15	- 28.429,23					
ZNS-17	ZNS-17 PTR - odobrenje; ZNS-17 NPT - privremeno odobrenje	02.12.2021.		6.868,41	5.838,14	29.052,99	24.695,04					
ZPL-17	ZNS-17 NPT - privremeno odobrenje; ZNS-17 PTR - odobrenje	02.12.2021.	13.12.2021.						30.533,18		30.533,18	
ZNS-17	ZNS-17 NPT - konačno odobrenje	23.12.2021.		29.052,99	24.695,04	- 29.052,99	- 24.695,04					
ZNS-18	ZNS-18 PTR - odobrenje	10.02.2022.		20.605,22	17.514,43							
ZPL-18	ZNS-18 PTR - odobrenje	10.02.2022.	24.02.2022.						17.514,43		17.514,43	
ZNS-19	ZNS-19 PTR - odobrenje; ZNS-19 NPT - privremeno odobrenje	09.05.2022.		22.848,23	19.421,00	16.043,75	13.637,19					
ZPL-19	ZNS-19 NPT - privremeno odobrenje; ZNS-19 PTR - odobrenje	09.05.2022.	31.05.2022.						33.058,18		33.058,18	
ZNS-19	ZNS-19 NPT - konačno odobrenje	07.06.2022.		16.043,75	13.637,19	- 16.043,75	- 13.637,19					
ZNS-20	ZNS-20 PTR - odobrenje; ZNS-20 NPT - privremeno odobrenje	06.07.2022.		10.412,10	8.850,29	56.274,47	47.833,30					
ZPL-20	ZNS-20 NPT - privremeno odobrenje; ZNS-20 PTR - odobrenje	06.07.2022.	15.07.2022.						56.683,59		56.683,59	
ZNS-20	ZNS-20 NPT - konačno odobrenje	17.08.2022.		56.274,47	47.833,30	- 56.274,47	- 47.833,30					
ZNS-21	ZNS-21 PTR - odobrenje; ZNS-21 NPT - privremeno odobrenje	18.08.2022.		6.868,41	5.838,14	106.712,80	90.705,88					
ZPL-21	ZNS-21 NPT - privremeno odobrenje; ZNS-21 PTR - odobrenje	18.08.2022.	05.09.2022.						96.544,02		96.544,02	
ZNS-21	ZNS-21 NPT - konačno odobrenje	26.09.2022.		106.712,80	90.705,88	- 106.712,80	- 90.705,88					
ZNS-22	ZNS-22 PTR - odobrenje; ZNS-22 NPT - privremeno odobrenje	28.09.2022.		13.736,81	11.676,29	24.868,99	21.138,64					
ZPL-22	ZNS-22 NPT - privremeno odobrenje; ZNS-22 PTR - odobrenje	28.09.2022.	07.10.2022.						32.814,93		32.814,93	
ZNS-22	ZNS-22 NPT - konačno odobrenje	27.10.2022.		24.868,99	21.138,64	- 24.868,99	- 21.138,64					



ZNS-23	ZNS-23 PTR - odobrenje	30.11.2022.		13.736,81	11.676,29							
ZPL-23	ZNS-23 PTR - odobrenje	30.11.2022.	12.12.2022.						11.676,29		11.676,29	
ZNS-24	ZNS-24 PTR - odobrenje; ZNS-24 NPT - privremeno odobrenje	21.02.2023.		13.736,81	11.676,29	6.159,79	5.235,82					
ZPL-24	ZNS-24 NPT - privremeno odobrenje; ZNS-24 PTR - odobrenje	21.02.2023.	06.03.2023.						16.912,11		16.912,11	
ZNS-24	ZNS-24 NPT - konačno odobrenje	24.03.2023.		6.159,79	5.235,82	- 6.159,79	- 5.235,82					



Europska unija
Zajedno do fondova EU









Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**

Tablica 8.: Pregled svih podnesenih zahtjeva za nadoknadom sredstava do 31.12.2022.

Pregled zahtjeva za nadoknadom sredstava + Dodaj

Oznaka ↑	Vrsta zahtjeva	Inačica	Potraživani plaćeni troškovi (EUR)	Potraživani neplaćeni troškovi (EUR)	Ukupni potraživani troškovi (EUR)	Ukupni odobreni troškovi (EUR)	Početak izvještajnog razdoblja	Završetak izvještajnog razdoblja	Status
ZNS-01	Među-zahtjev	3	18.315,76 €	0,00 €	18.315,76 €	18.315,76 €	20.07.2018.	31.08.2018.	Odobren
ZNS-02	Među-zahtjev	3	8.452,76 €	0,00 €	8.452,76 €	8.452,76 €	20.07.2018.	15.11.2018.	Odobren
ZNS-03	Među-zahtjev	1	6.557,63 €	0,00 €	6.557,63 €	6.557,63 €	20.07.2018.	31.12.2018.	Odobren
ZNS-04	Među-zahtjev	2	13.115,26 €	0,00 €	13.115,26 €	13.115,26 €	20.07.2018.	28.02.2019.	Odobren
ZNS-05	Među-zahtjev	2	19.596,45 €	0,00 €	19.596,45 €	19.596,45 €	20.07.2018.	31.05.2019.	Odobren
ZNS-06	Među-zahtjev	3	26.128,60 €	0,00 €	26.128,60 €	26.128,60 €	20.07.2018.	10.09.2019.	Odobren
ZNS-07	Među-zahtjev	2	19.596,45 €	0,00 €	19.596,45 €	19.596,45 €	20.07.2018.	11.12.2019.	Odobren
ZNS-08	Među-zahtjev	2	41.840,88 €	0,00 €	41.840,88 €	41.840,88 €	20.07.2018.	10.03.2020.	Odobren
ZNS-09	Među-zahtjev	1	20.605,23 €	0,00 €	20.605,23 €	20.605,23 €	20.07.2018.	04.06.2020.	Odobren
ZNS-10	Među-zahtjev	1	13.736,82 €	0,00 €	13.736,82 €	13.736,82 €	20.07.2018.	12.08.2020.	Odobren
ZNS-11	Među-zahtjev	1	20.605,23 €	0,00 €	20.605,23 €	20.605,23 €	20.07.2018.	05.11.2020.	Odobren
ZNS-12	Među-zahtjev	2	6.868,41 €	170.416,09 €	177.284,50 €	177.284,50 €	20.07.2018.	30.11.2020.	Odobren
ZNS-13	Među-zahtjev	1	13.736,82 €	0,00 €	13.736,82 €	13.736,82 €	20.07.2018.	02.02.2021.	Odobren
ZNS-14	Među-zahtjev	1	20.605,22 €	0,00 €	20.605,22 €	20.605,22 €	20.07.2018.	03.05.2021.	Odobren
ZNS-15	Među-zahtjev	2	13.736,82 €	118.919,64 €	132.656,46 €	132.656,46 €	20.07.2018.	08.07.2021.	Odobren
ZNS-16	Među-zahtjev	2	13.736,82 €	33.446,14 €	47.182,96 €	47.182,96 €	20.07.2018.	21.09.2021.	Odobren
ZNS-17	Među-zahtjev	3	6.868,41 €	29.052,98 €	35.921,39 €	35.921,39 €	20.07.2018.	22.10.2021.	Odobren
ZNS-18	Među-zahtjev	1	20.605,23 €	0,00 €	20.605,23 €	20.605,23 €	20.07.2018.	12.01.2022.	Odobren
ZNS-19	Među-zahtjev	3	22.848,24 €	16.043,75 €	38.891,99 €	38.891,99 €	20.07.2018.	06.04.2022.	Odobren
ZNS-20	Među-zahtjev	3	10.412,11 €	56.274,47 €	66.686,58 €	66.686,58 €	20.07.2018.	18.05.2022.	Odobren
ZNS-21	Među-zahtjev	2	6.868,41 €	106.712,79 €	113.581,20 €	113.581,20 €	20.07.2018.	30.06.2022.	Odobren
ZNS-22	Među-zahtjev	2	13.736,82 €	24.868,98 €	38.605,80 €	38.605,80 €	20.07.2018.	16.08.2022.	Odobren
ZNS-23	Među-zahtjev	1	13.736,82 €	0,00 €	13.736,82 €	13.736,82 €	20.07.2018.	24.10.2022.	Odobren
ZNS-24	Među-zahtjev	2	13.736,82 €	6.159,79 €	19.896,61 €	19.896,61 €	20.07.2018.	14.12.2022.	Odobren

Tablica 9.: Pregled zahtjeva za nadoknadom sredstava predanih u 2022. godini

	ZNS-18	Među-zahjev	1	20.605,23 €	0,00 €	20.605,23 €	20.605,23 €	20.07.2018.	12.01.2022.	Odobren
	ZNS-19	Među-zahjev	3	22.848,24 €	16.043,75 €	38.891,99 €	38.891,99 €	20.07.2018.	06.04.2022.	Odobren
	ZNS-20	Među-zahjev	3	10.412,11 €	56.274,47 €	66.686,58 €	66.686,58 €	20.07.2018.	18.05.2022.	Odobren
	ZNS-21	Među-zahjev	2	6.868,41 €	106.712,79 €	113.581,20 €	113.581,20 €	20.07.2018.	30.06.2022.	Odobren
	ZNS-22	Među-zahjev	2	13.736,82 €	24.868,98 €	38.605,80 €	38.605,80 €	20.07.2018.	16.08.2022.	Odobren
	ZNS-23	Među-zahjev	1	13.736,82 €	0,00 €	13.736,82 €	13.736,82 €	20.07.2018.	24.10.2022.	Odobren



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

Obzirom da je centralni prostor za obradu otpada RCGO Šagulje u vlasništvu Republike Hrvatske, pokrenute su aktivnosti oko dodjeljivanja prava gradnje na navedenom području.

Za pretovarnu stanicu Kutina potpisan je ugovor o pravu građenja s tvrtkom Eko moslavina d.o.o.

Za ostale pretovarne stanice slijedi pokretanje postupka imovinsko-pravnih odnosa.

3. OSTVARENI FINACIJSKI REZULTATI U 2022. GODINI

U 2022. godini potrošeno je 1.910.200,51 kn (253.527,18 EUR) europskih sredstava:

- 1.382.350,51 kn - studijsko-projektna dokumentacija,
- 527.850,00 kn - plaće članova projektnog tima i neizravni troškovi.

Ukupan trošak plaće svih zaposlenika RCGO Šagulje u 2022. godini iznosio je 663.009,89 kn. Od toga je:

- 459.000 kn financirano od EU, a
- 204.009,89 kn od strane Osnivača.

Također je, za potrebe financiranja izrade studijsko-projektne dokumentacije, potrošeno 81.314,74 kn sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost te 162.629,47 kn sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije.

3.1. Stanje imovine

Ukupna vrijednost aktive u 2022. godini iznosila je 8.743.994 kn, od čega je 7.254.469 kn vrijednost materijalne imovine, a 1.489.525 kn potraživanja i novac.

U nastavku u tablici se daje pregled bilance za 2022. godinu u usporedbi sa 2021. godinom.

Tablica 10: Bilanca na dan 31.12.2022.

(svi iznosi izraženi su u kunama)

STAVKA	BILJEŠKA	2021	2022
IMOVINA			
Dugotrajna imovina		4.614.276	7.254.469
Materijalna imovina		4.614.276	7.254.469
Kratkotrajna imovina		1.883.125	1.489.525
Potraživanja od države i drugih institucija		17.415	44.863
Ostala potraživanja		1.694	1.694
Novac u banci i blagajni		1.864.016	1.442.968
UKUPNO AKTIVA		6.497.401	8.743.994
<hr/>			
KAPITAL I REZERVE			
Upisani kapital		39.200	39.200

Zadržana dobit		14.080	14.599
Dobit / (gubitak) poslovne godine		519	0
Ukupno kapital		53.799	53.799
Kratkoročne obveze			
Obveze prema dobavljačima		12.416	70.611
Obveze prema zaposlenicima		35.789	81.103
Ostale kratkoročne obveze		82.480	84.250
Ukupne kratkoročne obveze		483.908	592.105
Odgođeni prihodi		5.959.694	8.098.090
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE		6.497.401	8.743.994

3.2. Financijski rezultati u 2022. godini

Tablica 11: Ostvareni financijski rezultati u 2022. godini s ocjenom poslovanja u odnosu na 2021. godinu

(svi iznosi izraženi su u kunama)

RB	Pozicija	2021	2022	Indeks
1	2	3	4	5(4/3x100)
1	Poslovni prihodi	1.025.829	922.204	89,80
2	Poslovni rashodi	1.044.111	931.233	89,10
3	Financijski prihodi	20.322	10.535	51,80
4	Financijski rashodi	2	64	3.200,00
5	Ukupni prihodi (1+3)	1.046.151	932.739	89,10
6	Ukupni rashodi (2+4)	1.044.113	931.297	89,10
7	Dobit prije oporezivanja (5-6)	2.038	1.442	70,70
8	Porez na dobit	1.520	1.442	94,80
9	Neto dobit tekuće godine (7-8)	518	0	

U 2022. godini subvencije od osnivača iznosile su ukupno 1.100.922,25 kn, od čega:

- Brodsko-posavska županija = 561.469,85 kn
- Požeško-slavonska županija = 269.726,20 kn
- Sisačko-moslavačka županija = 269.726,20 kn.

4. ZAKLJUČAK

Trgovačko društvo Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. koji je nositelj razvoja cjelovitoga sustava za gospodarenje otpadom na svomu obuhvatu mora biti centralno mjesto, kvalitetno i odgovorno te priuštivo na dobrobit svih stanovnika.

Sa ekološkoga aspekta RCGO Šagulje mora zadovoljavati sve kriterije koji su propisani Hrvatskim i EU zakonodavstvom u cilju očuvanja zdravlja i kvalitete života naših stanovnika.

Sa tehničko-tehnološkog aspekta RCGO Šagulje mora osigurati primjenu najbolje raspoloživih tehnologija definiranih sukladno EU zakonodavstvu i struci te koristiti isključivo u praksi potvrđenu i dokazanu tehnologiju. RCGO mora omogućiti da se sav ulazni otpad obradi i da se korisne i za recikliranje podobne sirovine izdvoje i predaju na daljnje recikliranje. Nadalje, da se sve sirovine podobne za energetske oporabu izdvoje, rafiniraju u potrebne kvalitete i stave tržištu energije na raspolaganje. Završno, sav preostali ostatak koji nije podoban za recikliranje ili energetske oporabu potrebno je obraditi na način koji zahtijevaju propisi i odložiti u sklopu centra na uređena odlagališta tako da taj otpad ne predstavlja opasnost za okoliš i buduće generacije.

U financijskom aspektu Izgradnje RCGO Šagulje je bitno iskoristiti sva moguća dostupna EU sredstva kod pripreme i kod provedbe navedenoga projekta radi rasterećenja poraćuna Osnivača društva. Nadalje, pri tome je svakako potrebno osigurati javno i transparentno trošenje, odnosno investiranje novca iz EU, nacionalnih i lokalnih sredstava.

Sa socijalnog aspekta RCGO mora osigurati adekvatna zelena radna mjesta, propisanu zaštitu na radu i sve ostale aspekte društveno-socijalne prihvatljivosti poput ispravnog informiranja, dana otvorenih vrata, pristupa centru itd.
