

**IZVJEŠĆE O RADU  
REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM  
ŠAGULJE d.o.o. ZA 2023. GODINU**



Slavonski Brod, svibanj 2024.

KLASA: 400-02/24-01/01  
URBROJ: 2178/01-33-24-01



## Sadržaj

<b>1. UVOD</b>	<b>4</b>
<b>1.1. OPIS DJELATNOSTI</b>	<b>5</b>
<b>1.2. OSNOVNI PODATCI O FINANCIRANJU PROJEKTA</b>	<b>6</b>
<b>1.3. VIZIJA I MISIJA DRUŠTVA</b>	<b>8</b>
<b>2. PROVEDENE AKTIVNOSTI U 2023. GODINI</b>	<b>9</b>
<b>2.1. PREGLED AKTIVNOSTI VEZANIH UZ IZRADU STUDIJSKO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TIJEKOM 2023. GODINE</b>	<b>9</b>
<b>2.2. PREGLED AKTIVNOSTI PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA IZRADE STUDIJSKO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RCGO ŠAGULJE</b>	<b>16</b>
<b>2.3. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ODLAGALIŠTA NEOPASNOG I INERTNOG OTPADA</b>	<b>17</b>
<b>2.4. IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA FOTONAPONSKU ELEKTRANU</b>	<b>17</b>
<b>2.5. PILOT PROJEKT VEZAN UZ ISKORIŠTAVANJE ENERGETSKOG POTENCIJALA OTPADA KAO RESURSA</b>	<b>18</b>
<b>2.6. OSTALE AKTIVNOSTI</b>	<b>18</b>
<b>2.7. RJEŠAVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA</b>	<b>23</b>
<b>3. OSTVARENI FINACIJSKI REZULTATI U 2023. GODINI</b>	<b>24</b>
<b>3.1. STANJE IMOVINE</b>	<b>25</b>
<b>3.2. FINACIJSKI REZULTATI U 2023. GODINI</b>	<b>26</b>
<b>4. ZAKLJUČAK</b>	<b>27</b>

**POPIS KRATICA:**

<b>Kratika:</b>	<b>Značenje:</b>
RCGO	Regionalni centar za gospodarenje otpadom
NKD	Nacionalna klasifikacija djelatnosti
NN	Narodne novine
RH	Republika Hrvatska
CGO	Centar za gospodarenje otpadom
PDV	Porez na dodanu vrijednost
BPŽ	Brodsko-posavska županija
PSŽ	Požeško-slavonska županija
SMŽ	Sisačko-moslavačka županija
VPŽ	Virovitičko-podravska županija
MINGOR	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
EU	Europska unija
EK	Europska komisija



## 1. UVOD

Trgovačko društvo **REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM ŠAGULJE d.o.o.** je regionalna komunalna tvrtka (u daljnjem tekstu: Društvo, RCGO) sa sjedištem u Slavonskom Brodu, osnovana s ciljem da organizira izgradnju te potom upravlja radom RCGO Šagulje u Novoj Gradiški. U vlasništvu je triju županija, i to: Brodsko-posavske (51%), Požeško-slavonske (24,5%) i Sisačko-moslavačke (24,5%).


Cilj osnivanja je uspostava sustava gospodarenja otpadom Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke te Virovitičko-podravске županije sukladno Strategiji i Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Osoba ovlaštena za zastupanje društva je predsjednik Uprave Josip Grgić, dipl.ing.stroj.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Obuhvat samog projekta prostire se na četiri županije, i to: dio Sisačko-moslavačke, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku i Virovitičko-podravsku županiju.

Slika 1: Obuhvat RCGO Šagulje

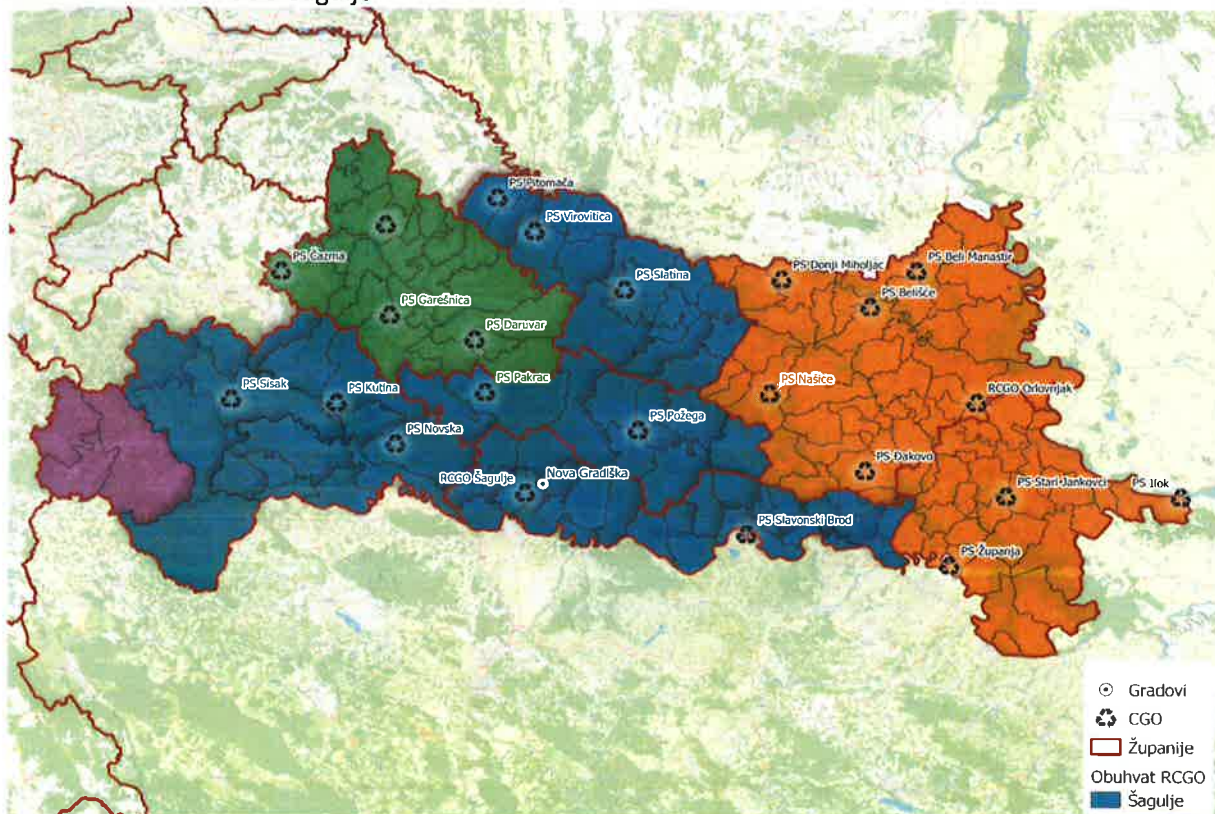


Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, prema RCGO Šagulje gravitirat će **392.937 stanovnika**.

## 1.1. Opis djelatnosti

Osnovna djelatnost RCGO Šagulje d.o.o. je, prema NKD klasifikaciji, gospodarenje otpadom.

Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj, Sisačko-moslavačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji osnovu nalazi u Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021), u Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) za razdoblje 2005. do 2025. i u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017.-2022. (NN 3/2017, 1/2022).

Slika 2: Prikaz tijeka otpada s pregledom nadležnosti u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom u RCGO Šagulje

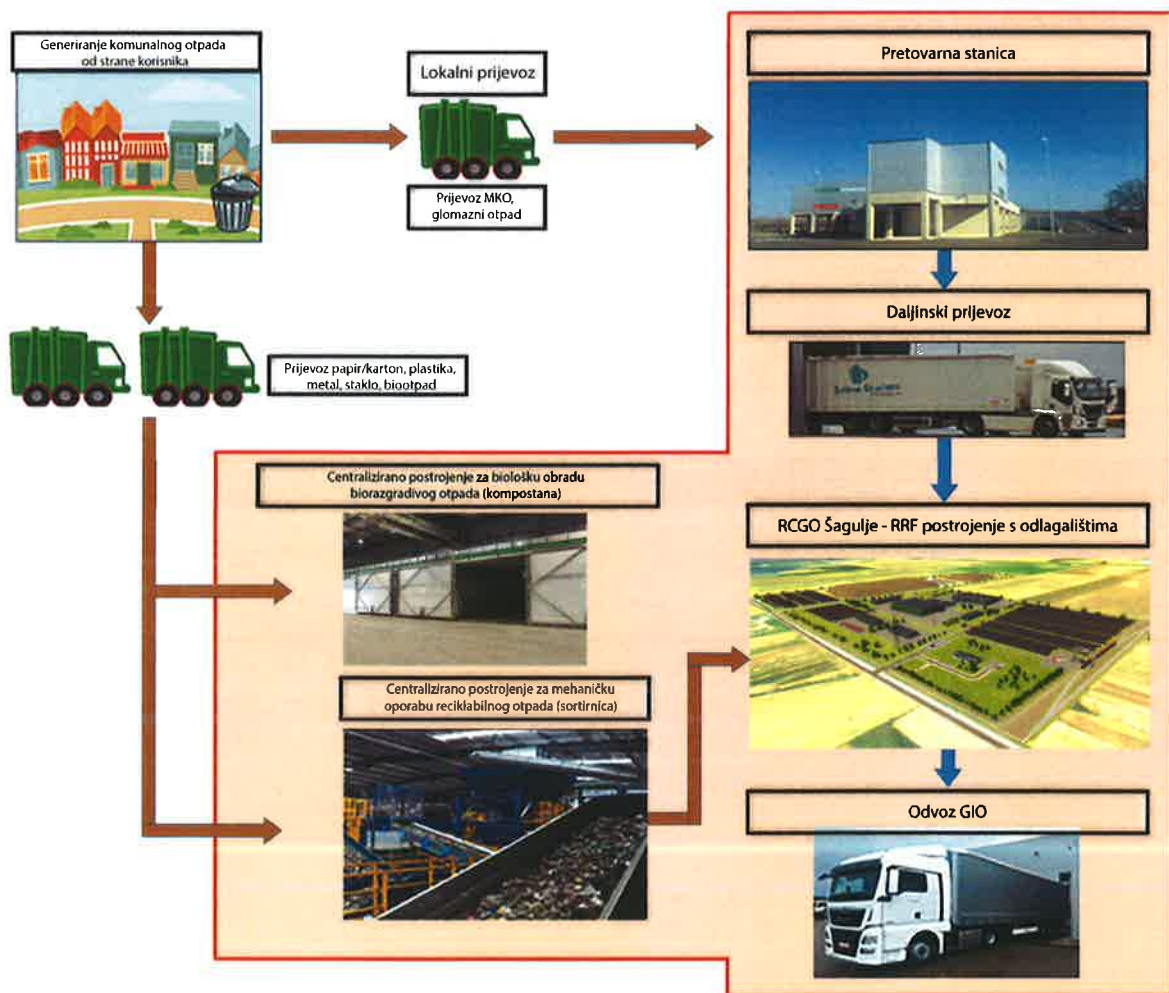

Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje zajedno sa pretovarnim stanicama predstavlja važan dio tog sustava koji se mora uspostaviti na regionalnoj razini, a koja će uspostava doprinijeti ispunjenju ciljeva iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6.1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, Plana gospodarenja otpadom RH 2023. - 2028. i Zakona o gospodarenju otpadom, na razini RH.

Centar za gospodarenje otpadom je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih



građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada, te je kao takav građevina za gospodarenje otpadom od državnog značaja prema članku 12. stavku 1. Zakona o gospodarenju otpadom.

Pretovarna stanica je građevina za privremeno skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove uporabe ili zbrinjavanja, odnosno u CGO.

Projekt obuhvaća ulaganje u izgradnju RCGO na lokaciji Šagulje, na području grada Nova Gradiška, izgradnju pretovarnih stanica te nabavku opreme potrebne za rad istih.

Razvoj Projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje podijeljen je u tri faze:

- **Pripremna faza:** priprema studijske i projektno-tehničke dokumentacije, provođenje upravnih postupaka pri nadležnim tijelima, ishođenje svih potrebnih administrativnih rješenja, lokacijskih dozvola, a sve u svrhu osiguranja sredstava za sufinanciranje Projekta RCGO Šagulje sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
- **Provedbena faza:** provedba postupaka javne nabave, ugovaranje, izvršavanje ugovora sklopljenih po provedenim postupcima, informiranje i edukacija stanovništva s obuhvata RCGO Šagulje o cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.
- **Operativna faza:** upravljanje izgrađenom infrastrukturom nakon preuzimanja Centra za gospodarenje otpadom i pretovarnih stanica.

S krajem 2023. godine RCGO Šagulje je završilo pripremnu fazu te čeka objavu uvjeta od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Europske komisije kako bi moglo krenuti u provedbenu fazu projekta.

## 1.2. Osnovni podatci o financiranju Projekta

Vrijednost projekta "Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o." iznosi 15.000.000,00 kuna.

Regionalni centar za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o. povukao je ukupno 14.700.000,00 kn (bez PDV-a) sredstava iz europskih fondova za provedbu pripremne faze projekta izgradnje CGO:

- **Bespovratna sredstva za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.** Posrednička tijela su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Ugovorom, koji je potpisan 20. srpnja 2018., dodjeljena su bespovratna sredstva u iznosu od **12.750.000,00kn** (bez PDV-a) što predstavlja **85%** ukupno prihvatljivih troškova Projekta: **Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje.**

Dodatkom III. Ugovoru, od 24.05.2023. godine, sredstva su smanjena sa 15.000.000 kn na 13.363.278,21 iz razloga ostvarenih ušteda prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi za izradu studijsko-projektne dokumentacije.

- Ugovorom o sufinanciranju provedbe projekta „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“, davanjem kapitalne pomoći odobrena su sredstva u iznosu od **750.000,00kn** (bez PDV-a), što čini **5%** procijenjenih i opravdanih troškova predmetnog projekta „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“.
- Dana 31. srpnja. 2018. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisalo je „**Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu**“. RCGO Šagulje d.o.o. prijavilo se na Javni poziv te zadovoljilo sve kriterije propisane predmetnim pozivom za dodjelu sredstava Fonda te je odabran za sufinanciranje. Dana 16. listopada 2018. godine odobrena je dodjela bespovratnih sredstava

Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu, u iznosu od **1.200.000,00 kn**. Sredstva su dodijeljena isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora u provedbi projekta „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“ koji se provodi na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju od 2014.-2020. Time je omogućeno da se cijeli Projekt financira iz bespovratnih sredstava EU/RH.

Danom 31.12.2023. godine završilo je projektno razdoblje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a s kojim su završili i navedeni ugovori o financiranju.

RCGO Šagulje je tijekom 2023. godine povuklo dodatna bespovratna EU sredstva u ukupnom iznosu od 430.917,54 eura, i to kako slijedi:

- 21.07.2023. – Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026., potpisan s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije.  
Predmetnim ugovorom financira se izrada projektno-tehničke dokumentacije za gradnju fotonaponske elektrane na području RCGO Šagulje. Prihvatljivi troškovi projekta iznose 201.075,05 eura, a dodijeljena bespovratna sredstva iznose 180.967,54 eura (90% prihvatljivih troškova).
- 29.08.2023. – Ugovor o financiranju izrade dodatne dokumentacije potrebne za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje, davanjem kapitalne pomoći, potpisan s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.  
Predmetnim ugovorom financira se izrada glavnih i izvedbenih projekata, troškovnika te dokumentacije o nabavi za izgradnju četiri odlagališne plohe. Sredstva su dodijeljena u iznosu od 200.000,00 eura, što čini 100% procijenjenih i opravdanih troškova izrade navedene dokumentacije.
- 21.12.2023. – Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju izrade dokumentacije za pripremu pilot - projekata vezanih uz iskorištavanje energetskeg potencijala otpada kao resursa, davanjem sredstava subvencije, potpisan s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.  
Predmetnim ugovorom financira se izrada Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi i idejnog rješenja kojim će se pronaći tehničko-tehnološko rješenje da se dio SRF-a iskoristi za dobivanje biometana i vodika. Ovakvom obradom smanjila bi se količina konačnog otpada koji je nužno zbrinuti. Obzirom da se na lokaciji planira izgradnja fotonaponske elektrane, projektom će se predvidjeti korištenje tako dobivene energije za pogon budućeg postrojenja. Biometan i vodik se smatraju obnovljivim izvorom energije te se mogu iskoristiti na licu mjesta za proizvodnju obnovljive električne energije.  
Iznos dodijeljenih sredstava je 49.950,00 eura i čini 100% procijenjenih i prihvatljivih troškova projekta.

### 1.3. Vizija i misija Društva

Slika 3: Vizija i misija Društva



#### Vizija

Odgovorno upravljanje izgrađenom infrastrukturom za gospodarenje otpadom zasnovanom na najvišim standardima zaštite okoliša i ljudskog zdravlja i osiguravanje održivosti uspostavljenog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u BPŽ, PSŽ, SMŽ i VPŽ

#### Misija

Izgraditi infrastrukturu za gospodarenje otpadom na regionalnoj razini, centar za gospodarenje otpadom i pretovarne stanice. Osigurati da se gospodarenje otpadom primjenom najsuvremenijih tehnologija obrade otpada odvija uz maksimalnu zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja.

Osigurati pretpostavke da uspostavljeni sustav odgovara dugoročnim potrebama i mogućnostima stanovništva BPŽ, PSŽ, SMŽ i VPŽ te da jamči njegovu održivost.

Edukacijom dionika omogućiti postizanje ciljeva projekta. Upravljati uspostavljenim sustavom na dobrobit današnjih i budućih generacija





## 2. PROVEDENE AKTIVNOSTI U 2023. GODINI

### 2.1. Pregled aktivnosti vezanih uz izradu studijsko-projektne dokumentacije tijekom 2023. godine

RCGO Šagulje d.o.o. u svojstvu Naručitelja ugovorilo je 01.10.2019. godine izradu cjelokupno potrebne studijsko-projektne dokumentacije projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje te pripadne infrastrukture, kroz 3 grupe nabave. Inicijalna postavka Projekta bilo je planirana prijava Projekta Šagulje na EU (su)financiranje putem operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, a sama izrada studijsko-projektne dokumentacije je također bila EU (su)financirani projekt.

#### 2.1.1. Izvršene aktivnosti i predana dokumentacija Naručitelju za Grupu 1

- **Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi za RCGO Šagulje i pretovarne stanice**  
**Aktivnost 1.** – Izvršena u potpunosti, nije dobiveno završno mišljenje JASPERS bez značajnih primjedbi
- **Idejno rješenje za RCGO Šagulje i prijedlog Idejnog rješenja tipske pretovarne stanice za potrebe Studije izvedivosti i za izradu Studije o utjecaju na okoliš**  
**Aktivnost 2.** – Izvršena u potpunosti, nije dobiveno završno mišljenje JASPERS bez značajnih primjedbi
- **Studija utjecaja zahvata na okoliš**  
**Aktivnost 3.** – Izvršena u potpunosti, 04. travnja 2022. ishođeno je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš
- **Dokumentacija potrebna za ishođenje lokacijske dozvole za RCGO**  
**Aktivnost 4.** – Izvršena aktivnost 100%, Naručitelj potvrdio završeni Idejni projekt, ishođeni svi potrebni posebni uvjeti i uvjeti priključenja te je dana 16.01.2023. ishođena lokacijska dozvola s kojom smo spremni za raspisivanje javnog natječaja za nabavu usluga, opreme i radova potrebnih za realizaciju navedenog projekta prema FIDIC žutoj knjizi (prema kojoj je obveza Izvođača izrada glavnih i izvedbenih projekata te ishođenje građevinskih dozvola)

Tijekom 2023. godine održana su tri sastanaka s JASPERS.

- 03. veljače 2023. godine
  - Prezentirani konačni tokovi otpada prema novom konceptu, uključujući i količine od Virovitičko-podravске županije
  - JASPERS će dostaviti predložak excel tablice prema kojoj će projektanti ispuniti podatke za RCGO Šagulje (ispunjeno 06.04.2023.)
- 29. lipnja 2023. godine
  - Potrebne manje izmjene u analizi tokova otpada nakon kojih se može nastaviti s ostalim aktivnostima – novelacija Studije izvedivosti, Analize troškova i koristi i prijavnog obrasca
- 27. studeni 2023. godine
  - Prezentirana ispravljena analiza tokova otpada, nakon čega je JASPERS prikazao pravilan način izračuna pro-rata pristupa EU granta.

Tablica 1.: Vrijednost izvršenih usluga – Grupa 1:

	UKUPNO (eur)	PDV (eur)	SVEUKUPNO (eur)
Vrijednost ugovorenih usluga	796.336,85	199.084,21	995.421,06
Ukupna vrijednost izvršenih usluga zaključno sa 12/2023	726.458,34	83.900,72	810.358,34

Tablica 2.: Pregled financiranja Grupe 1:

Vrijednost izvršenih usluga do 31.12.2023.	726.458,34
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 85% (MINGOR)	617.489,59
Ugovor o sufinanciranju u iznosu 5% (FZOEU)	36.322,92
Ugovor o sufinanciranju (MRRFEU)	72.645,83

## 2.1.2. Izvršene aktivnosti i predana dokumentacija Naručitelju za Grupu 2

### PS SLAVONSKI BROD

- 01.12.2023. godine predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
- U tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa Gradom Slavonskim Brodom za zemljište na kojem će se graditi predmetna pretovarna stanica

## PS POŽEGA

- 01.03.2023. godine sklopljen Ugovor o osnivanju prava služnosti s tvrtkom Komunalac Požega d.o.o.
- 16.11.2023. godine ishođena Građevinska dozvola
- U tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa Republikom Hrvatskom za zemljište na kojem će se graditi predmetna pretovarna stanica

Slika 4: Građevinska dozvola PS Požega

ID: P20230811-1335668-Z01



REPUBLIKA HRVATSKA  
Požeško-slavonska županija  
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša  
Sjedište Požega

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000132  
URBROJ: 2177-07-01/2-23-0015  
Požega, 06.11.2023.

Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sjedište Požega, OIB 48744373701, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Regionalni centar za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o., HR-35000 Slavonski Brod, Trg Pobjede 26A, OIB 95287565208 po opunomoćeniku Dragica Pašović, HR-10000 Zagreb, Petrovaradinska ulica 5A, OIB 01201938788, izdaje

### GRAĐEVINSKU DOZVOLU

- I. Dozvoljava se investitoru Regionalni centar za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o., HR-35000 Slavonski Brod, Trg Pobjede 26A, OIB 95287565208:

- građenje građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom (odlagalište), 2.a skupine, pretovarna stanica Požega na novoformiranoj građevinskoj čestici od dijelova k.č.br. 702, 701 k.o. Mihaljevci i polaganje vodova komunalne infrastrukture na k.č.br. 700 k.o. Mihaljevci,

u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake TD 13/2023 POŽEGA, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Dragica Pašović, dipl.ing.grad., broj ovlaštenja G 1057, a sadržava:

#### MAPA 1

arhitektonski projekt - prva mapa, oznake TD 13/2023 POŽEGA od 07.2023. godine

- projektant: Danijela Blažević, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 3641
- projektantski ured: Regionalni centar za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o., HR-35000 Slavonski Brod, Trg Pobjede 26A, OIB 95287565208

#### MAPA 2

građevinski projekt - konstrukcije, oznake TD 13/2023 POŽEGA od 07.2023. godine

- projektant: Branko Đopa, dipl.ing.grad., broj ovlaštenja G 3198
- projektantski ured: Regionalni centar za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o., HR-35000 Slavonski Brod, Trg Pobjede 26A, OIB 95287565208

#### MAPA 3

građevinski projekt - konstrukcije 2, oznake TD 13/2023 POŽEGA od 07.2023. godine

- projektant: Dragica Pašović, dipl.ing.grad., broj ovlaštenja G 1057
- projektantski ured: Regionalni centar za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o., HR-35000 Slavonski Brod, Trg Pobjede 26A, OIB 95287565208

#### MAPA 4

građevinski projekt - prometno - manipulativne površine, oznake TD 13/2023 POŽEGA od 07.2023. godine

- projektant: Tea Polak, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 6141
- projektantski ured: Regionalni centar za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o., HR-35000 Slavonski Brod, Trg Pobjede 26A, OIB 95287565208

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000132, URBROJ: 2177-07-01/2-23-0015

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/#-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.

1/4







## PS PAKRAC

- 13.07.2023. godine ishođena Građevinska dozvola
- U tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa Republikom Hrvatskom za zemljište na kojem će se graditi predmetna pretovarna stanica

Slika 5: Građevinska dozvola PS Pakrac

ID: P20230413-1257715-Z01



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**Požeško-slavonska županija**  
**Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i**  
**zaštitu okoliša**  
**Ispostava Pakrac**

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000064  
URBROJ: 2177-07-01/12-23-0028  
Pakrac, 13.07.2023.

Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Pakrac, OIB 48744373701, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Regionalni centar za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o., HR-35000 Slavonki Brod, Trg Pobjede 26A, OIB 95287565208 po opunomoćeniku DRAGICA PAŠOVIĆ, HR-10000 Zagreb, PETROVARADINSKA ULICA 5A, OIB 01201938788, izdaje

### GRAĐEVINSKU DOZVOLU

- I. Dozvoljava se investitoru Regionalni centar za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o., HR-35000 Slavonki Brod, Trg Pobjede 26A, OIB 95287565208:

- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom (odlagalište), 2.a skupine - Pretovarna stanica Pakrac

na novoformiranoj katastarskoj čestici k.č. br. 691/24 k.o. Kusonje, ( formirana od k.č. br. 691/24 k.o. Kusonje i k.č. br. 691/41 k.o. Kusonje (Kusonje) ).

u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake TD 02/2023, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Dragica Pašović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1057, a sadržava:

#### MAPA 1

**arhitektonski projekt - ispravak\_1**, oznake TD 02/2023 od 06.2023. godine

- projektant: Danijela Blažević, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 3641
- projektantski ured: HIDROPLAN d.o.o., HR-10000 Zagreb, Horvaćanska cesta 17A, OIB 60793646418

#### MAPA 2

**građevinski projekt - projekt konstrukcije\_ispravak\_1**, oznake TD 02/2023 od 06.2023. godine

- projektant: Branko Đopa, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3198
- projektantski ured: HIDROPLAN d.o.o., HR-10000 Zagreb, Horvaćanska cesta 17A, OIB 60793646418

#### MAPA 3

**građevinski projekt - projekt konstrukcije 2\_ispravak\_1**, oznake TD 02/2023 od 05.2023. godine

- projektant: Dragica Pašović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1057
- projektantski ured: HIDROPLAN d.o.o., HR-10000 Zagreb, Horvaćanska cesta 17A, OIB 60793646418

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000064, URBROJ: 2177-07-01/12-23-0028

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumiriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://signature.ec.europa.eu/eidas/#-browser>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.

1/5





## PS NOVSKA

- 27.09.2023. godine ishođena Građevinska dozvola
- U tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa Republikom Hrvatskom za zemljište na kojem će se graditi predmetna pretovarna stanica

Slika 6: Građevinska dozvola PS Novska

ID: P20230724-1325243-Z01



### REPUBLIKA HRVATSKA

#### Sisačko-moslavačka županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

graditeljstvo i obnovu

#### Ispostava Novska

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000044

URBROJ: 2176-08-01/1-23-0030

Novska, 27. rujna 2023.

Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, Ispostava Novska, OIB 82215698659, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor **REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM - ŠAGULJE d.o.o.**, HR-35000 Slavonki Brod, Trg Pobjede 26A, OIB 95287565208 zastupan po opunomoćeniku Danijeli Blažević, HR-10000 Zagreb, Novotnjevca 3, OIB 62796307590, izdaje

### GRAĐEVINSKU DOZVOLU

- I. Dozvoljava se investitoru **REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM - ŠAGULJE d.o.o.**, HR-35000 Slavonki Brod, Trg Pobjede 26A, OIB 95287565208:

- građenje građevine namijenjene gospodarenju otpadom, 2.a skupine, **PRETOVARNA STANICA NOVSKA**

na građevnoj čestici k.č.br. 1461/4 k.o. Brestača (Brestača),

u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake TD 11/2023 NOVSKA, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Dragica Pašović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1057, a sadržava:

#### MAPA 1

**arhitektonski projekt \_ ispravak 1**, oznake TD 11/2023 od kolovoza 2023. godine

- projektant: Danijela Blažević, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 3641
- projektantski ured: HIDROPLAN d.o.o., HR-10000 Zagreb, Horvaćanska cesta 17A, OIB 60793646418

#### MAPA 2

**građevinski projekt – konstrukcije \_ ispravak 1**, oznake TD 11/2023 od kolovoza 2023. godine

- projektant: Branko Đopa, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3198
- projektantski ured: HIDROPLAN d.o.o., HR-10000 Zagreb, Horvaćanska cesta 17A, OIB 60793646418

#### MAPA 3

**građevinski projekt - konstrukcije 2**, oznake TD 11/2023 od lipnja 2023. godine

- projektant: Dragica Pašović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1057
- projektantski ured: HIDROPLAN d.o.o., HR-10000 Zagreb, Horvaćanska cesta 17A, OIB 60793646418

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000044, URBROJ: 2176-08-01/1-23-0030

1/6

Ova elektronička isprava poljsana je kvalificiranim elektroničkim poljsom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U poljs je ugrađen vremenski pečat.



## PS KUTINA

- 18.01.2023. godine sklopljen ugovor s tvrtkom Eko Moslavina d.o.o. o osnivanju prava građenja
- 05.07.2023. godine ishođena Građevinska dozvola
- U tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa Republikom Hrvatskom za zemljište na kojem će se graditi predmetna pretovarna stanica

Slika 7: Građevinska dozvola PS Kutina

ID: P20230308-1230199-Z01



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
Sisačko-moslavačka županija  
Grad Kutina  
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000009  
URBROJ: 2176-3-09-01/02-23-0044  
Kutina, 05.07.2023.

Sisačko-moslavačka županija, Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, OIB 41888874500, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Regionalni centar za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o., HR-35000 Slavonski Brod, Trg Pobjede 26A, OIB 95287565208 zastupan po opunomoćeniku Dragici Pašović, HR-10000 Zagreb, Petrovaradinska ulica 5A, OIB 01201938788, izdaje

### GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru Regionalnom centru za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o., HR-35000 Slavonski Brod, Trg Pobjede 26A, OIB 95287565208:

- građenje građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom (odlagalište), 2.a skupine, zgrada za osoblje
- građenje građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom (odlagalište), 2.a skupine, pretovarna građevina
- građenje građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom (odlagalište), 2.a skupine, boks za glomazni otpad
- građenje građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom (odlagalište), 2.a skupine, mosna vaga

na katastarskim česticama br. 9684, 9685, 9686, 9687, 9688, 9689, 9690 k.o. Kutina (Kutina),

u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake TD 16/2022 KUTINA, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Dragica Pašović, dipl.ing. građ., broj ovlaštenja G 1057, a sadržava:

#### MAPA 1 - ispravak 2

arhitektonski projekt - vodeća mapa, oznake TD 16/2022 A od svibnja 2023. godine

- projektant: Danijela Blažević, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 3641
- projektantski ured: HIDROPLAN d.o.o., HR-10000 Zagreb, Horvaćanska cesta 17A, OIB 60793646418

#### MAPA 2 - ispravak 1

građevinski projekt - konstrukcije, oznake TD 16/2022 G - K od svibnja 2023. godine

- projektant: Branko Đopa, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3198
- projektantski ured: HIDROPLAN d.o.o., HR-10000 Zagreb, Horvaćanska cesta 17A, OIB 60793646418

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000009, URBROJ: 2176-3-09-01/02-23-0044 1/5  
Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/eidas/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.





### PS SISAK

- Izrađen geodetski projekt/elaborat
- Dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole  
Izrađena radna verzija idejnog projekta – koncepta
- U ožujku 2023. godine očekivala se izmjena Prostornog plana uređenja grada Siska nakon kojeg je trebao uslijediti nastavak izrade projektne dokumentacije za PS Sisak. Predmetna izmjena donesena je tek u listopadu 2023. godine te je nastavljeno s aktivnostima projektiranja.

### PS VIROVITICA

- Izrađeno i prihvaćeno Idejno rješenje
- Izrađen i predan Elaborat zaštite okoliša koji je predan u OPUO postupak dana 14.07.2023. te objavljen na stranicama Ministarstva 06.10.2023.

S ishođenim građevinskim dozvolama smo spremni za raspisivanje javnog natječaja za nabavu usluga, opreme i radova potrebnih za realizaciju navedenih projekata prema FIDIC crvenoj knjizi (prema kojoj je obveza Naručitelja izrada glavnih i izvedbnih projekata te ishođenje građevinskih dozvola).

Tablica 3.: Vrijednost izvršenih usluga – Grupa 2:

	UKUPNO (eur)	PDV (eur)	SVEUKUPNO (eur)
Vrijednost ugovorenih usluga	293.370,50	73.342,63	366.713,13
Ukupna vrijednost izvršenih usluga zaključno sa 12/2023	214.648,65	4.323,70	218.972,35

Tablica 4.: Pregled financiranja Grupe 2:

Vrijednost izvršenih usluga do 31.12.2023.	214.648,65
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 85% (MINGOR)	182.451,35
Ugovor o sufinanciranju u iznosu 5% (FZOEU)	10.732,43
Ugovor o sufinanciranju (MRRFEU)	21.464,87

### 2.1.3. Izvršene aktivnosti i predana dokumentacija Naručitelju za Grupu 3

Do 31.12.2023. godine izrađena je i predana:

- Dokumentacija o nabavi za pružanje usluga nadzora nad projektiranjem i izgradnjom RCGO Šagulje,
- Dokumentacija o nabavi za usluge nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica u obuhvatu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje,
- Dokumentacija o nabavi za usluge upravljanja projektom,
- Dokumentacija o nabavi za usluge promidžbe i vidljivosti projekta izgradnje RCGO Šagulje,

- Dokumentacija o nabavi projektiranja i izvođenja radova na izgradnji RCGO (Knjiga 1 – Upute ponuditeljima i ponudbeni obrasci; Knjiga 2 – Nacrt Ugovora i uvjeti Ugovora),
- Dokumentacija o nabavi radova na izgradnji Pretovarnih stanica (za četiri pretovarne stanice za koje su ishođene građevinske dozvole),
- Dokumentacija o nabavi opreme za RCGO i pretovarne stanice

Tablica 5.: Vrijednost izvršenih usluga – Grupa 3:

	UKUPNO (eur)	PDV (eur)	SVEUKUPNO (eur)
Vrijednost ugovorenih usluga	175.940,63	43.985,16	219.925,79
Ukupna vrijednost izvršenih usluga zaključno sa 12/2023	103.391,08	12.077,79	115.468,87

Tablica 6.: Pregled financiranja Grupe 3:

Vrijednost izvršenih usluga do 31.12.2023.	103.391,08
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 85% (MINGOR)	87.882,42
Ugovor o sufinanciranju u iznosu 5% (FZOEU)	5.169,55
Ugovor o sufinanciranju (MRRFEU)	10.339,11

## 2.2. Pregled aktivnosti promidžbe i vidljivosti Projekta izrade studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Šagulje

Ova aktivnost također je financirana Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, u iznosu od 85%, ugovorom o sufinanciranju provedbe projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Šagulje davanjem kapitalne pomoći, u iznosu od 5% te Ugovorom o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, u preostalom iznosu.

Na temelju sklopljenog Ugovora, izvršitelji su uvedeni u posao dana 25. kolovoza 2021. godine.

U skladu s Ugovorom i Projektnim zadatkom te planiranim aktivnostima iz Terminskog/ Dinamičkog plana provedene su slijedeće aktivnosti:

### Osmišljavanje, grafički dizajn, priprema za tisak i dostava promotivnih materijala:

- Plakat
- Info brošura
- Rolo baner
- USB memorija
- Reklamni eko mini notes s kemijskom olovkom i memo listovima

### Medijska promidžba

- Izrada i oblikovanje materijala za objavu na web stranici projekta i društvenim mrežama te kontinuirano ažuriranje objavljenih informacija
- Zakup prostora na društvenim mrežama i Google platformama
- Zakup/emitiranje radio spota od 30 sec
- Zakup/emitiranje radijskog sadržaja
- Izrada/objava članka o projektu na prvom i drugom najposjećenijem lokalnom news portalu
- Dizajn, izrada i formatiranje web banneri

Tablica 7.: Vrijednost izvršenih aktivnosti – Promidžba i vidljivost

	UKUPNO (eur)	PDV (eur)	SVEUKUPNO (eur)
Vrijednost ugovorenih usluga	23.213,22	5.803,31	29.016,53
Ukupna vrijednost izvršenih usluga zaključno sa 12/2023	12.568,84	3.142,21	15.729,05

Tablica 8.: Pregled financiranja promidžbe i vidljivosti:

Vrijednost izvršenih usluga do 31.12.2021.	12.568,84
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 85% (MINGOR)	10.683,51
Ugovor o sufinanciranju u iznosu 5% (FZOEU)	628,44
Ugovor o sufinanciranju (MRRFEU)	1.256,88

### 2.3. Izrada projektne dokumentacije za odlagališta neopasnog i inertnog otpada

Obzirom da financiranje izrade dokumentacije za odlagališta i izgradnja odlagališta neopasnog i inertnog otpada više nije EU prihvatljiv trošak, RCGO Šagulje je osiguralo sredstva za navedeno financiranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

Sredstva za financiranje izrade projektne dokumentacije dodijelio je Fond u 100% iznosu od 200.000 EUR.

Proveden je natječaj javne nabave te je sklopljen ugovor za izvršenje predmetne usluge.

### 2.4. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za fotonaponsku elektranu

U mjesecu kolovozu 2022. godine RCGO Šagulje se prijavilo na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije u vrijednosti 1.515.000 kn. Financiranje od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije iznosi 90%.





Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU sklopljen je dana 21.07.2023. godine.

Proveden je postupak javne nabave za predmet nabave Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za fotonaponsku elektranu za RCGO Šagulje.

Predmet je podijeljen u tri grupe (Izrada idejnog i glavnog projekta; Izrada Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi; Izrada Dokumentacije o nabavi) te su sklopljena tri ugovora o nabavi predmetnih usluga.

Na temelju izrađene projektno-tehničke dokumentacije RCGO Šagulje će ishoditi građevinsku dozvolu za izgradnju fotonaponske elektrane na lokaciji Centra, priključne snage 3 MW a koja će služiti za potrebe napajanja Centra električnom energijom.

## 2.5. Pilot projekt vezan uz iskorištavanje energetskeg potencijala otpada kao resursa

U mjesecu srpnju 2023. godine RCGO Šagulje se prijavilo na Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskeg potencijala otpada kao resursa (jp eu-5/2023).

Prijavljeni projekt je pozitivno ocijenjen te su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 49.950 EUR.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Fondom za zaštitu okoliša i energetskeg učinkovitost sklopljen je dana 21. prosinca 2023. godine.

## 2.6. Ostale aktivnosti

Tijekom 2023. godine podneseno je pet zahtjeva za nadoknadom sredstava Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i pet zahtjeva za nadoknadom sredstava Fondu za zaštitu okoliša i energetskeg učinkovitost. U nastavku se daje financijski pregled svih podnesenih zahtjeva.

Tijekom izvještajnog razdoblja, Projektni tim RCGO Šagulje sudjelovao je u radu Grupacije Centara za gospodarenje otpadom kroz davanje komentara na prijedloge izmjena zakonske regulative.

Projektni tim također je surađivao s jedinicama lokalne samouprave u obuhvatu RCGO Šagulje prilikom izrade izmjena Prostornih planova istih.

Tablica 9.: Financijski pregled projekta temeljem svih odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava do 31.12.2023.

Šifra projekta	Financijski pregled	Datum odobrenja / Datum prijave	Godišnja iznosa / Godišnja iznosa (EUR)	Godišnja iznosa / Godišnja iznosa (EUR)	Godišnja iznosa / Godišnja iznosa (EUR)	Godišnja iznosa / Godišnja iznosa (EUR)	Godišnja iznosa / Godišnja iznosa (EUR)	Godišnja iznosa / Godišnja iznosa (EUR)	Godišnja iznosa / Godišnja iznosa (EUR)	Godišnja iznosa / Godišnja iznosa (EUR)	Godišnja iznosa / Godišnja iznosa (EUR)
ZNS-01	ZNS-01 PTR - odobrenje	30.10.2018.	130.000,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00
ZPL-01	ZNS-01 PTR - odobrenje	31.10.2018.									
ZNS-02	ZNS-02 PTR - odobrenje	14.12.2018.	63.637,33	54.134,23	54.134,23	54.134,23	54.134,23	54.134,23	54.134,23	54.134,23	54.134,23
ZPL-02	ZNS-02 PTR - odobrenje	14.12.2018.									
ZNS-03	ZNS-03 PTR - odobrenje	21.02.2019.	49.408,48	41.997,20	41.997,20	41.997,20	41.997,20	41.997,20	41.997,20	41.997,20	41.997,20
ZPL-03	ZNS-03 PTR - odobrenje	21.02.2019.									
ZNS-04	ZNS-04 PTR - odobrenje	27.03.2019.	98.816,95	83.994,42	83.994,42	83.994,42	83.994,42	83.994,42	83.994,42	83.994,42	83.994,42
ZPL-04	ZNS-04 PTR - odobrenje	27.03.2019.									
ZNS-05	ZNS-05 PTR - odobrenje	08.07.2019.	147.649,26	125.501,87	125.501,87	125.501,87	125.501,87	125.501,87	125.501,87	125.501,87	125.501,87
ZPL-05	ZNS-05 PTR - odobrenje	08.07.2019.									
ZNS-06	ZNS-06 PTR - odobrenje	27.09.2019.	196.865,68	167.335,83	167.335,83	167.335,83	167.335,83	167.335,83	167.335,83	167.335,83	167.335,83
ZPL-06	ZNS-06 PTR - odobrenje	27.09.2019.									
ZNS-07	ZNS-07 PTR - odobrenje	02.01.2020.	147.649,26	125.501,87	125.501,87	125.501,87	125.501,87	125.501,87	125.501,87	125.501,87	125.501,87
ZPL-07	ZNS-07 PTR - odobrenje	02.01.2020.									
ZNS-08	ZNS-08 PTR - odobrenje	10.04.2020.	915.250,00	267.962,50	267.962,50	267.962,50	267.962,50	267.962,50	267.962,50	267.962,50	267.962,50
ZPL-08	ZNS-08 PTR - odobrenje	10.04.2020.									
ZNS-09	ZNS-09 PTR - odobrenje	10.07.2020.	155.250,00	131.962,50	131.962,50	131.962,50	131.962,50	131.962,50	131.962,50	131.962,50	131.962,50
ZPL-09	ZNS-09 PTR - odobrenje	10.07.2020.									
ZNS-10	ZNS-10 PTR - odobrenje	26.08.2020.	103.500,00	87.975,00	87.975,00	87.975,00	87.975,00	87.975,00	87.975,00	87.975,00	87.975,00
ZPL-10	ZNS-10 PTR - odobrenje	27.08.2020.									
ZNS-11	ZNS-11 PTR - odobrenje	27.11.2020.	155.250,00	131.962,50	131.962,50	131.962,50	131.962,50	131.962,50	131.962,50	131.962,50	131.962,50
ZPL-11	ZNS-11 PTR - odobrenje	27.11.2020.									
ZNS-12	ZNS-12 PTR - odobrenje; ZNS-12 NPT - privremeno odobrenje	17.12.2020.	51.750,00	43.987,50	43.987,50	43.987,50	43.987,50	43.987,50	43.987,50	43.987,50	43.987,50
ZPL-12	ZNS-12 NPT - privremeno odobrenje; ZNS-12 PTR - odobrenje	17.12.2020.									
ZNS-13	ZNS-12 NPT - konatno odobrenje	01.03.2021.	1.284.000,00	-1.284.000,00	-1.284.000,00	-1.284.000,00	-1.284.000,00	-1.284.000,00	-1.284.000,00	-1.284.000,00	-1.284.000,00
ZPL-13	ZNS-13 PTR - odobrenje	01.03.2021.	103.500,00	87.975,00	87.975,00	87.975,00	87.975,00	87.975,00	87.975,00	87.975,00	87.975,00

ZPL-13	ZNS-13 PTR - odobrenje	02.03.2021.	10.03.2021.	155.250,00	131.962,50	87.975,00	87.975,00	87.975,00
ZNS-14	ZNS-14 PTR - odobrenje	08.06.2021.						
ZPL-14	ZNS-14 PTR - odobrenje	08.06.2021.	21.06.2021.	103.500,00	97.975,00	896.000,00	761.000,00	131.962,50
ZNS-15	ZNS-15 PTR - odobrenje ZNS-15 NPT - privremeno odobrenje	29.07.2021.						
ZPL-15	ZNS-15 NPT - privremeno odobrenje ZNS-15 PTR - odobrenje	29.07.2021.	26.08.2021.	896.000,00	761.000,00	896.000,00	761.000,00	896.575,00
ZNS-15	ZNS-15 NPT - konačno odobrenje	16.09.2021.						
ZNS-16	ZNS-16 PTR - odobrenje ZNS-16 NPT - privremeno odobrenje	27.10.2021.		103.500,00	87.975,00	290.000,00	214.200,00	
ZPL-16	ZNS-16 NPT - privremeno odobrenje ZNS-16 PTR - odobrenje	27.10.2021.	15.11.2021.					302.175,00
ZNS-16	ZNS-16 NPT - konačno odobrenje	22.11.2021.		252.000,00	214.200,00	252.000,00	214.200,00	
ZNS-17	ZNS-17 PTR - odobrenje ZNS-17 NPT - privremeno odobrenje	02.12.2021.		91.750,00	43.987,50	218.899,23	186.064,77	
ZPL-17	ZNS-17 NPT - privremeno odobrenje ZNS-17 PTR - odobrenje	02.12.2021.	13.12.2021.					230.052,27
ZNS-17	ZNS-17 NPT - konačno odobrenje	23.12.2021.		218.899,23	186.064,77	218.899,23	186.064,77	
ZNS-18	ZNS-18 PTR - odobrenje	10.02.2022.		153.250,00	131.962,50			131.962,50
ZPL-18	ZNS-18 PTR - odobrenje	10.02.2022.	24.02.2022.					
ZNS-19	ZNS-19 PTR - odobrenje ZNS-19 NPT - privremeno odobrenje	09.05.2022.		172.150,00	146.327,50	120.891,62	102.746,38	
ZPL-19	ZNS-19 NPT - privremeno odobrenje ZNS-19 PTR - odobrenje	09.05.2022.	31.05.2022.					249.076,88
ZNS-19	ZNS-19 NPT - konačno odobrenje	07.06.2022.		120.891,62	102.746,38	120.891,62	102.746,38	
ZNS-20	ZNS-20 PTR - odobrenje ZNS-20 NPT - privremeno odobrenje	06.07.2022.		78.850,00	66.582,50	424.000,00	360.400,00	
ZPL-20	ZNS-20 NPT - privremeno odobrenje ZNS-20 PTR - odobrenje	06.07.2022.	15.07.2022.					427.082,50
ZNS-20	ZNS-20 NPT - konačno odobrenje	17.08.2022.		424.000,00	360.400,00	424.000,00	360.400,00	
ZNS-21	ZNS-21 PTR - odobrenje ZNS-21 NPT - privremeno odobrenje	18.08.2022.		51.750,00	43.987,50	804.027,57	661.423,43	
ZPL-21	ZNS-21 NPT - privremeno odobrenje ZNS-21 PTR - odobrenje	18.08.2022.	05.09.2022.					727.410,93
ZNS-21	ZNS-21 NPT - konačno odobrenje	26.09.2022.		804.027,57	661.423,43	804.027,57	661.423,43	



ZNS-22	ZNS-22 PTR - odobrenje; ZNS-22 NPT - privremeno odobrenje	28.05.2022	13.736,81	11.676,29	24.868,99	21.138,64	32.814,93	32.814,93
ZPL-22	ZNS-22 NPT - privremeno odobrenje; ZNS-22 PTR - odobrenje	07.10.2022.	24.868,99	21.138,64	-24.868,99	-21.138,64		
ZNS-23	ZNS-23 PTR - konacno odobrenje	27.10.2022.	13.736,81	11.676,29	6.159,79	5.235,82	11.676,29	11.676,29
ZPL-23	ZNS-23 PTR - odobrenje	30.11.2022.	13.736,81	11.676,29	6.159,79	5.235,82	16.912,11	16.912,11
ZNS-24	ZNS-24 NPT - privremeno odobrenje; ZNS-24 PTR - odobrenje	21.02.2023.	6.159,79	5.235,82	-6.159,79	-5.235,82	32.941,80	32.941,80
ZNS-25	ZNS-25 PTR - odobrenje; ZNS-25 NPT - privremeno odobrenje	24.03.2023.	13.736,81	11.676,29	38.755,06	32.941,80	44.618,09	44.618,09
ZPL-25	ZNS-25 NPT - privremeno odobrenje; ZNS-25 PTR - odobrenje	31.03.2023.	38.755,06	32.941,80	-38.755,06	-32.941,80		
ZNS-26	ZNS-26 NPT - konacno odobrenje	20.04.2023.	6.868,41	5.838,14	13.875,36	11.794,05	17.652,20	17.652,20
ZPL-26	ZNS-26 PTR - odobrenje; ZNS-26 NPT - privremeno odobrenje	24.04.2023.	6.868,41	5.838,14	13.875,36	11.794,05		
ISP-01	SF-01 PTR - odobrenje - ZNS-25	27.04.2023.	0,00	0,00				
ZNS-26	ZNS-26 NPT - konacno odobrenje (SF-01); ZNS-26 NPT - konacno odobrenje	05.07.2023.	13.875,36	11.794,05	-13.875,36	-11.794,05		
ZNS-27	ZNS-27 PTR - odobrenje (ukladanje ZNS-26); ZNS-27 PTR - odobrenje	07.07.2023.	20.605,22	17.514,43				
ZPL-27	ZNS-27 PTR - odobrenje	24.07.2023.	0,00	0,00				
ZNS-28	ZNS-28 PTR - odobrenje; ZNS-28 NPT - privremeno odobrenje	02.10.2023.	13.736,81	11.676,29	45.535,28	38.704,99	17.514,43	17.514,43
ZPL-28	ZNS-28 NPT - privremeno odobrenje; ZNS-28 PTR - odobrenje	02.10.2023.	45.535,28	38.704,99	-45.535,28	-38.704,99	50.381,28	50.381,28
ZNS-29	ZNS-29 PTR - odobrenje; ZNS-29 NPT - privremeno odobrenje	30.11.2023.	19.608,80	16.668,33	179.534,83	152.604,60	169.272,93	169.272,93
ZPL-29	ZNS-29 NPT - privremeno odobrenje; ZNS-29 PTR - odobrenje	01.12.2023.	179.534,83	152.604,60	-179.534,83	-152.604,60		
ZNS-29	ZNS-29 NPT - konacno odobrenje	20.12.2023.	152.604,60	152.604,60				
			<b>1.185.144,94</b>	<b>1.185.144,94</b>	<b>1.185.144,94</b>	<b>1.185.144,94</b>	<b>1.185.144,94</b>	<b>1.185.144,94</b>

Tablica 10.: Pregled svih podnesenih zahtjeva za nadoknadom sredstava do 31.12.2023.

Oznaka	Datum	Vrsta zahtjeva	Potraživani plaćeni troškovi (EUR)	Potraživani neplaćeni troškovi (EUR)	Ukupni potraživani troškovi (EUR)	Ukupni odobreni troškovi (EUR)
ZNS-01	01.10.2018.	Među-zahtjev	18.315,75	0,00	18.315,75	18.315,75
ZNS-02	19.11.2018.	Među-zahtjev	8.452,76	0,00	8.452,76	8.452,76
ZNS-03	11.01.2019.	Među-zahtjev	6.557,63	0,00	6.557,63	6.557,63
ZNS-04	19.03.2019.	Među-zahtjev	13.115,26	0,00	13.115,26	13.115,26
ZNS-05	14.06.2019.	Među-zahtjev	19.596,42	0,00	19.596,42	19.596,42
ZNS-06	11.09.2019.	Među-zahtjev	26.128,57	0,00	26.128,57	26.128,57
ZNS-07	11.12.2019.	Među-zahtjev	19.596,42	0,00	19.596,42	19.596,42
ZNS-08	10.03.2020.	Među-zahtjev	41.840,87	0,00	41.840,87	41.840,87
ZNS-09	05.06.2020.	Među-zahtjev	20.605,22	0,00	20.605,22	20.605,22
ZNS-10	13.08.2020.	Među-zahtjev	13.736,81	0,00	13.736,81	13.736,81
ZNS-11	06.11.2020.	Među-zahtjev	20.605,22	0,00	20.605,22	20.605,22
ZNS-12	11.12.2020.	Među-zahtjev	6.868,41	170.416,09	177.284,50	177.284,50
ZNS-13	15.02.2021.	Među-zahtjev	13.736,81	0,00	13.736,81	13.736,81
ZNS-14	05.05.2021.	Među-zahtjev	20.605,22	0,00	20.605,22	20.605,22
ZNS-15	09.07.2021.	Među-zahtjev	13.736,81	118.919,64	132.656,45	132.656,45
ZNS-16	22.09.2021.	Među-zahtjev	13.736,81	33.446,15	47.182,96	47.182,96
ZNS-17	25.10.2021.	Među-zahtjev	6.868,41	29.052,99	35.921,40	35.921,40
ZNS-18	13.01.2022.	Među-zahtjev	20.605,22	0,00	20.605,22	20.605,22
ZNS-19	08.04.2022.	Među-zahtjev	22.848,23	16.043,75	38.891,98	38.891,98
ZNS-20	25.05.2022.	Među-zahtjev	10.412,10	56.274,47	66.686,57	66.686,57
ZNS-21	01.07.2022.	Među-zahtjev	6.868,41	106.712,80	113.581,21	113.581,21
ZNS-22	17.08.2022.	Među-zahtjev	13.736,81	24.868,99	38.605,80	38.605,80
ZNS-23	25.10.2022.	Među-zahtjev	13.736,81	0,00	13.736,81	13.736,81
ZNS-24	15.12.2022.	Među-zahtjev	13.736,81	6.159,79	19.896,60	19.896,60
ZNS-25	17.02.2023.	Među-zahtjev	13.736,80	38.755,06	52.491,86	52.491,88
ZNS-26	20.03.2023.	Među-zahtjev	6.868,41	13.875,36	20.743,77	20.743,77
ZNS-27	07.06.2023.	Među-zahtjev	20.605,23	0,00	20.605,23	20.605,23
ZNS-28	18.08.2023.	Među-zahtjev	13.736,82	45.535,28	59.272,10	59.272,10
ZNS-29	11.11.2023.	Među-zahtjev	19.609,81	179.534,83	199.144,64	199.144,64
<b>UKUPNO:</b>			<b>460.604,86</b>	<b>839.595,20</b>	<b>1.300.200,06</b>	<b>1.300.200,08</b>

## 2.7. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

### RCGO Šagulje

Zemljište na kojem će se graditi RCGO u vlasništvu je Republike Hrvatske, osim kanala u vlasništvu Brodsko-posavske županije. Zahtjev za skapanjem Ugovora o pravu gradnje je poslan 10.03.2023. Tražena je nadopuna dokumentacije koja nedostaje: pravomoćnost lokacijske dozvole i procjembeni elaborat. Dopuna zahtjeva predana je 20.04.2023. - priložena pravomoćnost lokacijske dozvole. Pokrenuta je izrada procjembenog elaborata te će isti, po završetku, biti predan Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Zbog izmjene i dopune lokacijske dozvole potrebno je čekati izmjene u katastru kako bi se elaborat mogao kompletirati.

### PS Kutina

- potpisan je ugovor o pravu građenja s tvrtkom Eko moslavina d.o.o, za dio zemljišta koje je u njihovom vlasništvu,
- za dio zemljišta koji je u vlasništvu Republike Hrvatske pokrenute su aktivnosti stjecanja prava gradnje – zahtjev predan dana 10.03.2023.
- Dopuna zahtjeva predana 05.09.2023. (priložen traženi procjembeni elaborat)

### PS Požega

- sklopljen ugovor o pravu služnosti puta s tvrtkom Komunalac d.o.o.,
- za dio zemljišta koji je u vlasništvu Republike Hrvatske pokrenute su aktivnosti stjecanja prava gradnje – zahtjev predan 10.03.2023.
- Dopuna zahtjeva predana 04.05.2023. (priložena tražena pravomoćnost lokacijske dozvole)
- Dopuna zahtjeva predana 07.11.2023. (priložen traženi procjembeni elaborat)

### PS Pakrac

- zemljište u cijelosti u vlasništvu Republike Hrvatske te su pokrenute aktivnosti stjecanja prava gradnje – zahtjev predan 10.03.2023.
- 12.12.2023. potpisan Ugovor o osnivanju prava građenja, upisan u zemljišne knjige 15.12.2023.

### PS Novska

- zemljište u cijelosti u vlasništvu Republike Hrvatske te su pokrenute aktivnosti stjecanja prava gradnje – zahtjev predan 10.03.2023.
- Odlukom Ministarstva odobreno pravo gradnje. Upisano u zemljišne knjige 6.12.2023.

Za sve predmete u vlasništvu Republike Hrvatske priloženi su sljedeći dokumenti:

1. lokacijska informacija
2. potvrda Hrvatskih šuma da se nekretnina nalazi u obuhvatu šumskogospodarske osnove
3. potvrda Porezne o nepostojanju duga
4. potvrda Hrvatskih šuma da na nekretnini nije bilo protupravnih prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji
5. potvrda Hrvatskih šuma da su za nekretninu podmirene dospjele obveze s osnovekorištenja, prijašnjeg protupravnog prisvajanja i drugih protupravnih radnji na nekretnini od strane predlagatelja
6. zk. izvadak i posjedovni list
7. Lokacijska dozvola
8. Procjembeni elaborati

## PS Slavonski Brod

Dana 07.04.2023. godine predan Zahtjev za sklapanjem Ugovora o pravu građenja. Na sjednici gradskog vijeća, dana 06.07.2023. godine, točka dnevnog reda povučena je bez obrazloženja.

Dana 05.10.2023. godine poslana zamolba za žurnim donošenjem Odluke na podneseni zahtjev.

Na sjednici gradskog vijeća održanoj dana 15.02.2024. godine donesena je Odluka o pravu građenja na čestici na kojoj će se graditi pretovarna stanica, ali nije odlučeno o služnosti puta koji je sastavni dio predmetne čestice i koji je bio sastavni dio zahtjeva podnesenog 07.04.2023. Na naš upit dobili smo odgovor kako predmetna odluka ne mora ići na gradsko vijeće te da posebno podnesemo zahtjev za služnost puta, o kojem zahtjevu će odlučivati Gradonačelnik.

### 3. OSTVARENI FINACIJSKI REZULTATI U 2023. GODINI

U 2023. godini potrošeno je 555.398,46 eur europskih sredstava:

- 499.555,42 eur - studijsko-projektna dokumentacija,
- 55.843,04 eur - plaće članova projektnog tima i neizravni troškovi.

Ukupan trošak plaće svih zaposlenika RCGO Šagulje u 2023. godini iznosio je 89.412,61 eur. Od toga je:

- 55.843,04 eur financirano od EU, a
- 33.569,57 eur od strane Osnivača.

S danom 31.12.2023. godine završilo je projektno razdoblje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupno iskorištena EU sredstva isplaćena od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (u iznosu od 85%) iznose: 1.277.310,84 eur.

Ukupno isplaćena sredstva koja su osigurana od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje provedbe projekta „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Šagulje“ davanjem kapitalne pomoći) iznose: 53.113,34 eur.

Ukupno isplaćena sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kojim se financira 10% vlastitog učešća u projektu iznose: 106.226,69 eur.



### 3.1. Stanje imovine

Ukupna vrijednost aktive u 2023. godini iznosila je 1.973.752 eur, od čega je 1.906.387 eur vrijednost materijalne imovine, a 67.365 eur potraživanja i novac.

U nastavku u tablici se daje pregled bilance za 2023. godinu u usporedbi sa 2022. godinom.

Tablica 11: Bilanca na dan 31.12.2023.

(svi iznosi izraženi su u eurima)

STAVKA	BILJEŠKA	2022	2023
<b>IMOVINA</b>			
Dugotrajna imovina		1.211.062	1.906.387
Materijalna imovina		1.211.062	1.906.387
Kratkotrajna imovina		197.694	67.365
Potraživanja od države i drugih institucija		5.954	29.494
Ostala potraživanja		225	284
Novac u banci i blagajni		191.515	37.587
<b>UKUPNO AKTIVA</b>		<b>1.408.756</b>	<b>1.973.752</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
Upisani kapital		5.203	5.203
Zadržana dobit		1.825	1.834
Dobit / (gubitak) poslovne godine		8,49	0,01
Ukupno kapital		485.287	678.465
Kratkoročne obveze			
Obveze prema dobavljačima		9.372	2.694
Obveze prema zaposlenicima		10.764	4.287
Ostale kratkoročne obveze		11.182	18.181
Ukupne kratkoročne obveze		75.388	83.095
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja		848.081	1.212.192
<b>UKUPNO PASIVA</b>		<b>1.408.756</b>	<b>1.973.752</b>

### 3.2. Financijski rezultati u 2023. godini

Tablica 12: Ostvareni financijski rezultati u 2023. godini s ocjenom poslovanja u odnosu na 2022. godinu

(svi iznosi izraženi su u eurima)

RB	Pozicija	2022	2023	Indeks
1	2	3	4	5(4/3x100)
1	Poslovni prihodi	105.843	85.593	80,87
2	Poslovni rashodi	105.655	85.384	80,81
3	Financijski prihodi	22	22	1
4	Financijski rashodi	8	0	0
5	<b>Ukupni prihodi (1+3)</b>	<b>105.865</b>	<b>85.615</b>	<b>80,87</b>
6	<b>Ukupni rashodi (2+4)</b>	<b>105.663</b>	<b>85.384</b>	<b>80,81</b>
7	Dobit prije oporezivanja (5-6)	201	230	114
8	Porez na dobit	192	230	120
9	<b>Neto dobit tekuće godine (7-8)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	

U 2023. godini subvencije od osnivača iznosile su ukupno 277.218,33 eur, od čega:

- Brodsko-posavska županija = 141.381,35 eur
- Požeško-slavonska županija = 67.918,49 eur
- Sisačko-moslavačka županija = 67.918,49 eur.



## 4. ZAKLJUČAK

Trgovačko društvo Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. bit će nositelj razvoja cjelovitoga sustava za gospodarenje otpadom na svom obuhvatu.

Centar za gospodarenje otpadom bit će centralno mjesto za kvalitetno i odgovorno gospodarenje otpadom sukladno svim standardima zaštite okoliša te priuštivo za sve korisnike usluga Centra.

Provedba strateških odrednica RCGO Šagulje d.o.o. je dugotrajan proces u koji su uključene različite razine zadužene za rješavanje pojedine tematike te u mnogome ovise o dobroj suradnji, koordinaciji i političkoj stabilnosti dionika svih razina uključenih u provedbu.

Dobrom suradnjom Županija Osnivača, RCGO Šagulje kao nositelja projekta, s resornim ministarstvom i Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost uspješno smo završili veliku većinu potrebne projektne dokumentacije te smo time spremni za slijedeću fazu provedbe projekta.

Iz navedenih informacija jasno je vidljivo rasterećenje proračuna Osnivača u 100%-tnom iznosu za izradu studijsko-projektne dokumentacije.

Predsjednik Uprave  
Josip Grgić, dipl.ing.stroj.

  
REGIONALNI CENTAR ZA  
GOSPODARENJE OTPADOM  
**ŠAGULJE**  
d.o.o.  
TRG POBJEDE 26A, SLAVONSKI BROD
