

REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE
OTPADOM – ŠAGULJE d.o.o.
35 000 SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 26a

KLASA: 024-02/24-01-04
URBROJ: 2178/1-33-24-03
Slavonski Brod, 24. listopada 2024.

Na temelju čl.4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva Regionalni centar za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o., članovi Nadzornog odbora Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. na svojoj sjednici održanoj dana 24.10.2024. godine donijeli su slijedeću

ODLUKU

Usvaja se Plan rada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 2025. godinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora

Olivera Maglić, dipl.ing.stroj



REGIONALNI CENTAR ZA
GOSPODARENJE OTPADOM
ŠAGULJE
d.o.o.
1 TRG POBJEDE 26A, SLAVONSKI BROD

Dostaviti:

- Članovima Nadzornog odbora
- Josip Grgić, predsjednik Uprave
- Arhiva
- Računovodstvo RCGO Šagulje d.o.o.



Europska unija
Zajedno do fondova EU




Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Projekt je sufinancirala Europska unija iz OP Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.

PLAN RADA REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM ŠAGULJE d.o.o. ZA 2025. GODINU

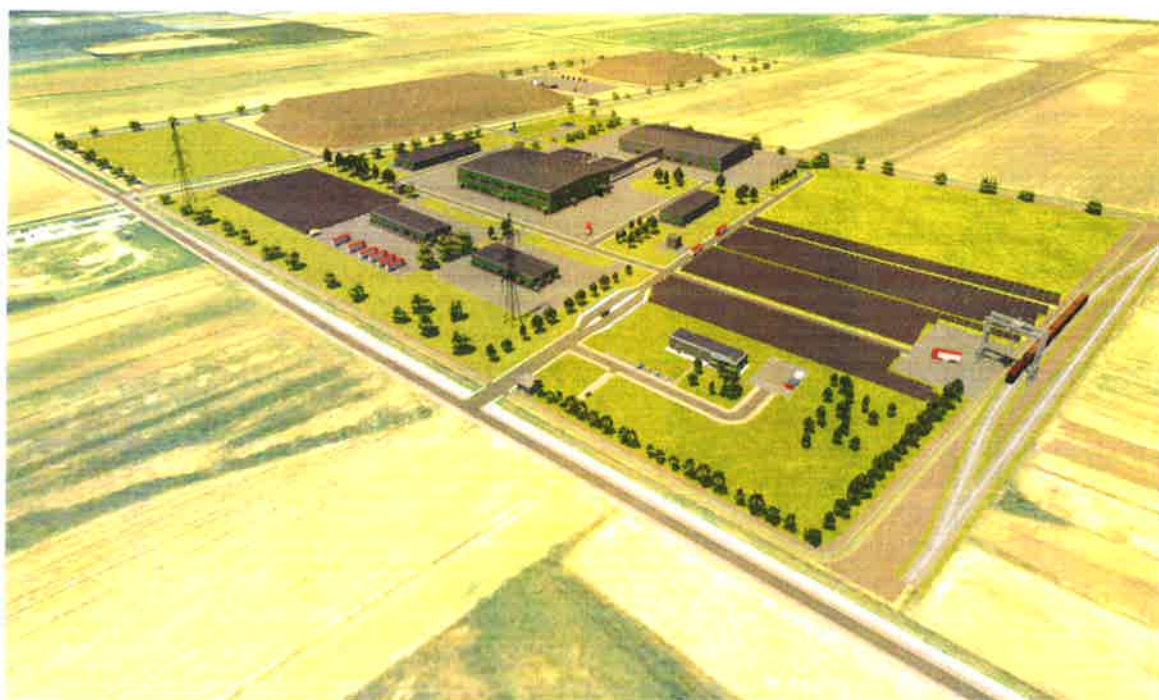

Slavonski Brod, listopad 2024.



Sadržaj

1. UVOD	4
1.1. OPIS DJELATNOSTI	5
2. REKAPITULACIJA UČINJENOG U 2024. GODINI	7
3. PLAN POSLOVNIH AKTIVNOSTI ZA 2025. GODINU	10
4. FINACIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU	15





POPIS KRATICA:

Kratika:	Značenje:
RCGO	Regionalni centar za gospodarenje otpadom
NKD	Nacionalna klasifikacija djelatnosti
NN	Narodne novine
RH	Republika Hrvatska
CGO	Centar za gospodarenje otpadom
PDV	Porez na dodanu vrijednost
ZGO	Zakon o gospodarenju otpadom
BPŽ	Brodsko-posavska županija
PSŽ	Požeško-slavonska županija
SMŽ	Sisačko-moslavačka županija
VPŽ	Virovitičko-podravska županija
MZOZT	Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
FZOEU	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
EU	Europska unija

1. UVOD

Trgovačko društvo Centar za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije osnovano je 21.12.2010. godine. Doregistrirano je 04.12.2017. godine u **REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM ŠAGULJE d.o.o.**

U vlasništvu je triju županija: Brodsko-posavske (51%), Požeško-slavonske (24,5%) i Sisačko-moslavačke (24,5%) a cilj osnivanja je da organizira izgradnju te potom upravlja radom RCGO Šagulje u Novoj Gradiški.


Društvo je osnovano kako bi se uspostavio sustav gospodarenja otpadom Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke i Virovitičko-podravске županije, a sve sukladno Strategiji i Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Osoba ovlaštena za zastupanje društva je predsjednik Uprave Josip Grgić, dipl.ing.stroj.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Obuhvat samog projekta prostire se na četiri županije, i to: dio Sisačko-moslavačke, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku i Virovitičko-podravsku županiju.

Slika 1: Obuhvat RCGO Šagulje

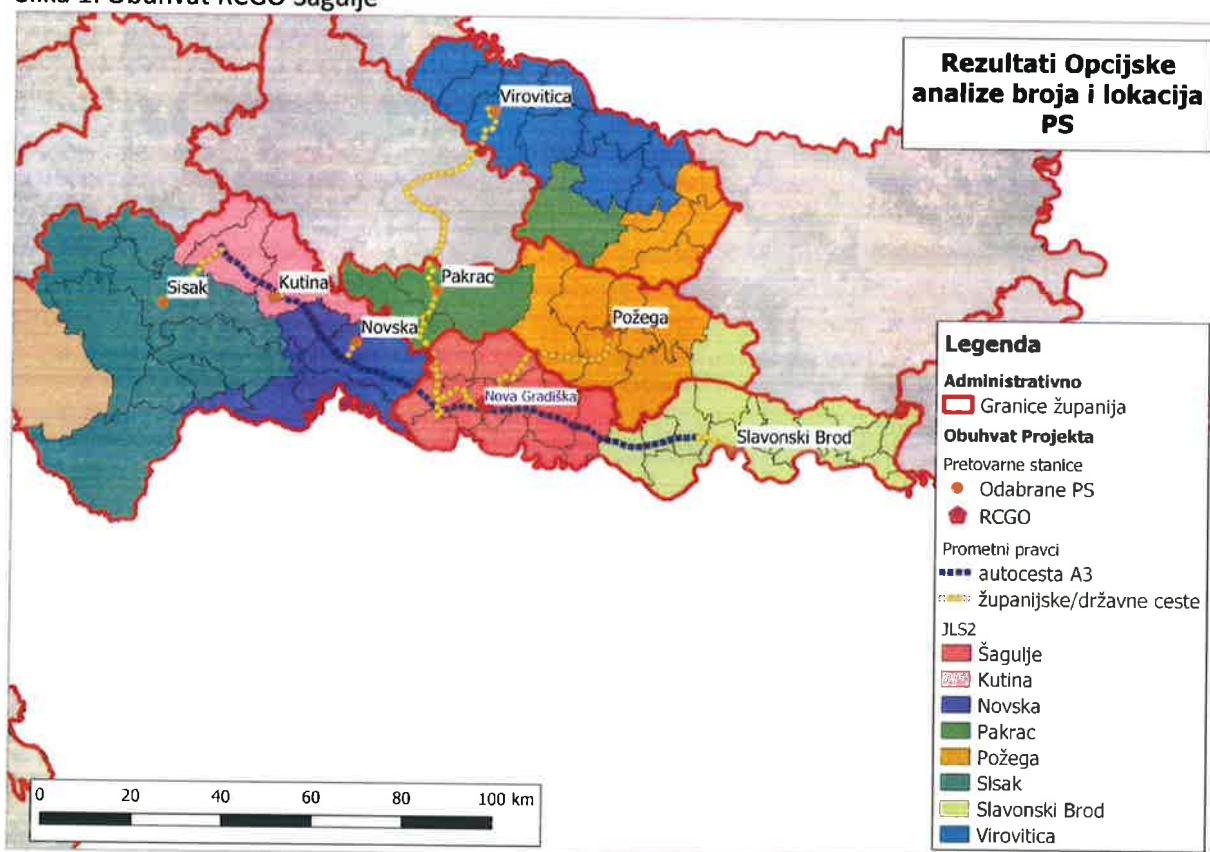

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, prema RCGO Šagulje gravitirat će **406.411 stanovnik.**

1.1. Opis djelatnosti

Osnovna djelatnost RCGO Šagulje d.o.o. je gospodarenje otpadom.

Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj, Sisačko-moslavačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji osnovu nalazi u Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021, 142/23), u Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) za razdoblje 2005. do 2025. i u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2023.-2028. (NN 84/2023).

Slika 2: Prikaz kružnog gospodarstva s pregledom nadležnosti u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom



Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje zajedno sa pretovarnim stanicama predstavlja važan dio tog sustava koji se mora uspostaviti na regionalnoj razini, a koja će uspostava doprinijeti ispunjenju ciljeva iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6.1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, Plana gospodarenja otpadom RH 2023.-2028. i Zakona o gospodarenju otpadom, na razini RH.

Centar za gospodarenje otpadom je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada, te je kao takav građevina za gospodarenje otpadom od državnog značaja prema članku 12. stavku 1. Zakona o gospodarenju otpadom. Pretovarna stanica je građevina za privremeno skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove uporabe ili zbrinjavanja, odnosno u CGO.



Sukladno članku 10. Zakona o gospodarenju otpadom, gospodarenje otpadom i građenje građevina za gospodarenje otpadom od interesa su za Republiku Hrvatsku.

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i Planu gospodarenja otpadom RH jedinice lokalne samouprave su u obvezi, u sklopu javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (čl. 64. Zakona), osigurati uslugu prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge:

1. miješanog komunalnog otpada
2. biootpada
3. reciklabilnog komunalnog otpada i
4. glomaznog otpada jednom godišnje te
 - uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu
 - uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi.

CGO je, prije svega, postrojenje za obradu miješanog komunalnog otpada i njegova zakonska obveza je preuzimanje i obrada miješanog komunalnog otpada (ZGO čl. 13. st.3) dok su za druge tokove otpada zadužene jedinice lokalne samouprave (papir, plastika, staklo, metal, tekstil, građevinski otpad, odvojeno prikupljeni biootpad).

CGO može prihvaćati, osim miješanog komunalnog otpada, i druge vrste komunalnog otpada, što je potrebno regulirati sporazumom (čl. 13. ZGO).



2. REKAPITULACIJA UČINJENOG U 2024. GODINI

RCGO Šagulje d.o.o. u svojstvu Naručitelja ugovorilo je 01.10.2019. godine izradu cjelokupno potrebne studijsko-projektne dokumentacije projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje te pripadne infrastrukture, kroz 3 grupe nabave. Inicijalna postavka Projekta bilo je planirana prijava Projekta Šagulje na EU (su)financiranje putem operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, a sama izrada studijsko-projektne dokumentacije je također bila EU (su)financirani projekt.

Pregled izrađene dokumentacije za RCGO Šagulje

- **Izrađena Studija izvedivosti – MBO koncept**
- **Izrađena Studija utjecaja na okoliš – MBO koncept** – proveden postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i ishođeno Rješenje prihvatljivosti zahvata za okoliš
- **Izrađeno Idejno rješenje i Idejni projekt** – ishođena Lokacijska dozvola za Centar – MBO koncept
- **Izrađeno novelirano Idejno rješenje i Idejni projekt prema RRF konceptu**
- **Izrađena novelacija Studije izvedivosti** poglavlja 1 – 8 i Idejnog projekta za izmjenu i dopunu Lokacijske dozvole koja je ishođena 10.11.2023.
- **Novelacija Studije izvedivosti poglavlja 9 – 12, Analize troškova i koristi i prijavnog obrasca** izrađena u prosincu 2023. godine.

Slijedeći koraci:

- Potvrda Studije izvedivosti od strane JASPERS – Completion note
- Objava SGEI od strane Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije – udio državnih potpora u sektoru otpada da bi se kompletirala CBA analiza i započeo proces objave natječaja za izgradnju RCGO-a.ijeme potrebno za ishođenje potrebnih dokumenata (Rješenja MINGOR, Posebnih uvjeta i Lokacijske dozvole)

Popis izrađene dokumentacije za PS

- Izrađeni Elaborati zaštite okoliša, provedeni OPUO postupci i ishođena Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za PS Kutina (19.08.2022.), PS Novska (12.10.2022.), PS Pakrac (14.06.2022.), PS Požega (24.05.2022.) i PS Slavonski Brod (06.06.2022.);
- Izrađena Idejna rješenja i Idejni projekti za 5 PS za koje su i ishođene Lokacijske dozvole: Kutina (12.10.2022.), Novska (17.11.2022.), Pakrac (17.11.2022.), Slavonski Brod (28.03.2023.) i Požega (03.04.2023.);
- Izrađeni Glavni projekti za 5 PS: Kutina, Pakrac, Novska, Požega i Slavonski Brod. Za PS Kutinu (05.07.2023.), Pakrac (13.07.2023.), Novska (28.09.2023.), Požega (06.11.2023.) i Slavonski Brod (28.06.2024.) ishođene Građevinske dozvole.
- PS Sisak – izrađeno Idejno rješenje i elaborat zaštite okoliša koji je predan 20.10.2023. Objavljeno na stranicama Ministarstva 14.11.2023. Rješenje ishođeno 16.04.2024.
- PS Virovitica – prema povećanom obuhvatu RCGO Šagulje na Virovitičko-podravsku županiju potrebna dodatna PS – održan sastanak gdje je potvrđena lokacija za pretovarnu stanicu – izrađeno i prihvaćeno Idejno rješenje i EZO koji je predan u OPUO postupak 14.07.2023., te objavljen na stranicama Ministarstva 16.10.2023. Rješenje ishođeno 15.05.2024.

Slijedeći koraci:

- **Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa**
 - PS Kutina – potpisan Ugovor o pravu građenja s tvrtkom Eko Moslavina bez naknade, potrebno isto napraviti i s Republikom Hrvatskom – predan zahtjev 10.03.2023.
 - Za PS Novska, PS Pakrac i PS Požega – potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose s Republikom Hrvatskom – predani zahtjevi za sklapanjem Ugovora o pravu građenja 10.03.2023.
 - PS Slavonski Brod – riješeni imovinsko-pravni odnosi s gradom Slavonskim Brodom za pretovarnu stanicu. Ugovor o osnivanju prava građenja potpisan 08.05.2024. Nije riješeno pravo gradnje na pristupnom putu, što mora biti riješeno do ishoda uporabne dozvole.

Izrađena Dokumentacija o nabavi – Grupa 3

- Dostavljene i prihvaćene dokumentacije o nabavi, i to:
 - Dokumentacija o nabavi projektiranja i izvođenja radova na izgradnji RCGO
 - Knjiga 1 – Upute ponuditeljima i ponudbeni obrasci
 - Knjiga 2 – Nacrt Ugovora i uvjeti Ugovora
 - Dokumentacija o nabavi za pružanje usluga nadzora nad izvođenjem radova RCGO
 - Nadzor nad izvođenjem radova RCGO-a
 - Dokumentacija o nabavi opreme za RCGO i PS
 - Grupa 1 – Nabava specijalnih vozila
 - Grupa 2 – Transport – prikolice i utovar
 - Grupa 3 – Oprema za manipulaciju otpadom
 - Grupa 4 – Oprema za rad i održavanje
 - Grupa 5 – Oprema za recikliranje i preradu otpada
 - Grupa 6 – Oprema za skladištenje otpada i goriva
 - Dokumentacija o nabavi za pružanje usluga rada s javnošću
 - Dokumentacija o nabavi za pružanje usluga tehničke pomoći
 - Dokumentacija o nabavi za izvođenje radova na izgradnji pretovarnih stanica
 - Dokumentacija o nabavi za pružanje usluga nadzora nad izvođenjem radova na PS

Izrada projektne dokumentacije za odlagalište za neopasni otpad i odlagalište za inertni otpad

Obzirom da financiranje izrade dokumentacije za odlagališta i izgradnja odlagališta neopasnog i inertnog otpada više nije EU prihvatljiv trošak, osigurali smo sredstva za navedeno financiranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Sredstva za financiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije dodijeljena su u 100% iznosu od 200.000 EUR.

Provedena je javna nabava za uslugu izrade navedene dokumentacije i sklopljen ugovor o nabavi. Izrađeni su glavni projekti i predani zahtjevi za ishoda građevinskih dozvola za oba odlagališta. Ishoda građevinskih dozvola očekuje se do kraja mjeseca listopada 2024.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za fotonaponsku elektranu za RCGO Šagulje

Sredstva za financiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za fotonaponsku elektranu RCGO Šagulje osigurana su Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2024., a na temelju provedenog natječaja na koji smo se prijavili u 2023. godini.



Na ovu investiciju RCGO Šagulje se odlučilo temeljem Zaključka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za klimatske aktivnosti od 10. lipnja 2022. godine, a vezano uz uklanjanje šumske površine od cca 2 ha, na području pretovarnih stanica Pakrac i Novska.

Navedenim Zaključkom propisana je obveza nadoknade trajnog zaposjedanja površine od cca 2ha šuma, a koju je RCGO Šagulje trebalo obrazložiti u Elaboratu zaštite okoliša.

Sukladno izrađenim Elaboratima zaštite okoliša za pretovarne stanice Pakrac i Novsku, uklanjanje šumskog pokrova kao ponora ugljika, nadoknadit će se ugradnjom solarnih panela na lokaciji pretovarnih stanica ili na lokaciji RCGO Šagulje.

Planirana je izgradnja fotonaponske elektrane na lokaciji RCGO Šagulje, priključne snage 3 MW, za vlastite potrebe, kako bi se nadoknadio ponor ugljika te kako bi RCGO Šagulje ostvarilo uštede u operativnim troškovima, poglavito električne energije.

Od projektne dokumentacije za fotonaponsku elektranu izrađen Elaborat zaštite okoliša i predan u resorno ministarstvo na postupak OPUO.

Izrađena je radna verzija glavnog projekta te je, s komentarima vraćena izvršiteljima na doradu.

Započeta je izrada Studije izvedivosti, sukladno raspoloživim informacijama.

Projektno-tehnička dokumentacija za fotonaponsku elektranu planira se završiti do kraja 2025. godine te će biti spremna za prijavu na buduće natječaje za financiranje izgradnje fotonaponske elektrane.



3. PLAN POSLOVNIH AKTIVNOSTI ZA 2025. GODINU

Slika 3: Vizija i misija Društva



Vizija

Odgovorno upravljanje izgrađenom infrastrukturom za gospodarenje otpadom zasnovanom na najvišim standardima zaštite okoliša i ljudskog zdravlja i osiguravanje održivosti uspostavljenog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u BPŽ, PSŽ, SMŽ i VPŽ

Misija

Izgraditi infrastrukturu za gospodarenje otpadom na regionalnoj razini, centar za gospodarenje otpadom i pretovarne stanice. Osigurati da se gospodarenje otpadom primjenom najsuvremenijih tehnologija obrade otpada odvija uz maksimalnu zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja.

Osigurati pretpostavke da uspostavljeni sustav odgovara dugoročnim potrebama i mogućnostima stanovništva BPŽ, PSŽ, SMŽ i VPŽ te da jamči njegovu održivost.

Edukacijom dionika omogućiti postizanje ciljeva projekta. Upravljanje uspostavljenim sustavom na dobrobit današnjih i budućih generacija.



Temeljem naprijed iznesene rekapitulacije učinjenog u 2024. godini, utvrđuju se ciljevi i aktivnosti za 2025. godinu kako slijedi:

CILJ 1.: Osiguranje financijskih sredstava i provođenje postupaka javne nabave

Najistaknutije planirane aktivnosti u 2025. godini usmjerene su na izradu projektne prijave na Operativni program za financiranje projekta izgradnje RCGO Šagulje i dvije pretovarne stanice koje nisu predmet financiranja NPOO.

Uz izradu projektne prijave odradit će se i aktivnosti objave i provedbe javnih natječaja za slijedeće predmete nabave:

- Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji RCGO Šagulje;
- Pružanje usluga tehničke pomoći i/ili upravljanja projektom
- Pružanje usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji RCGO Šagulje
- Pružanje usluga promidžbe i vidljivosti
- Izvođenje radova na izgradnji pretovarnih stanica
- Nabava opreme (uključujući vozila za prijevoz otpada od Pretovarnih stanica do RCGO Šagulje) za RCGO i PS
- Nabava radova izgradnje Odlagališta za neopasni otpad – Zona 7 i Odlagališta za inertni otpad – Zona 8

CILJ 1: Osiguranje financijskih sredstava i provođenje postupaka javne nabave	2025											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Odobrenje novelirane studije izvedivosti od strane JASPERS												
Sklapanje novog ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava												
Sklapanje ugovora o davanju kapitalne pomoći FZOEU												
Provođenje postupaka javne nabave												

Dokumentacija o nabavi za navedene predmete nabave je izrađena u sklopu Ugovora za izradu dokumentacije o nabavi radova, usuga i opreme za izgradnju RCGO Šagulje i pretovarnih stanica u svrhu sufinanciranja projekta sredstvima EU.

Dokumentacija o nabavi radova izgradnje odlagališta neopasnog i inertnog otpada bit će izrađena u sklopu Ugovora o uslugama izrade projektne dokumentacije Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje – Odlagalište za neopasni otpad – Zona 7 i Odlagalište za inertni otpad – Zona 8.

CILJ 2.: Realizacija projekta izgradnje pretovarnih stanica u obuhvatu RCGO Šagulje

Za izgradnju pet pretovarnih stanica za koje su ishođene građevinske dozvole (PS Slavonski Brod, PS Požega, PS Pakrac, PS Kutina, PS Novska) provedeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Plan je do kraja 2024. godine ugovoriti radove na izgradnji navedenih pretovarnih stanica te usluge nadzora nad izgradnjom istih i usluge

vođenja projekta za iste.

Tijekom 2025. godine planira se provedba navedenih Ugovora.

CILJ 2: Realizacija projekta izgradnje pretovarnih stanica u obuhvatu RCGO Šagulje	2025											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Izgradnja pretovarnih stanica u obuhvatu RCGO Šagulje												
Provođenje usluga stručnog nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica u obuhvatu RCGO Šagulje												
Provođenje usluga voditelja projekta "Izgradnja pretovarnih stanica u obuhvatu RCGO Šagulje"												
Praćenje i administriranje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz NPOO												

CILJ 3.: Realizacija projekta izrade projektno-tehničke dokumentacije za fotonaponsku elektranu za RCGO Šagulje

Nastavak aktivnosti započete u 2024. godini.

Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026., broj C2.1.R2.I1.01.052, sklopljenim s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, razdoblje provedbe projekta „RCGO Šagulje – fotonaponska elektrana“ traje do 31. svibnja 2025. godine. Do kraja razdoblja provedbe projekta plan je ishoditi svu dokumentaciju potrebnu za izgradnju fotonaponske elektrane, sukladno sklopljenim ugovorima, a koja će biti priprema za prijavu projekta izgradnje fotonaponske elektrane u narednim godinama.

CILJ 3: Realizacija projekta izrade projektno-tehničke dokumentacije za fotonaponsku elektranu za RCGO Šagulje	2025				
	I	II	III	IV	V
Izrada idejnog i glavnog projekta					
Izrada Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi					
Izrada Dokumentacije o nabavi					
Praćenje i administriranje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava					

CILJ 4.: Riješeni imovinsko-pravni odnosi

CILJ 3: Riješeni imovinsko-pravni odnosi	2025	kompletna kronologija
	OPIS AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI
RCGO ŠAGULJE	10.3.2023. predani zahtjevi za sklapanjem Ugovora o pravu građenja. Zahtjev uredan i kompletiran. Čeka se odluka Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.	10.3.2023. predani zahtjevi za sklapanjem Ugovora o pravu građenja. Zahtjev uredan i kompletiran. Čeka se odluka Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
PRETOVARNA STANICA SLAVONSKI BROD		7.4.2023. predan zahtjev za sklapanjem Ugovora o pravu građenja. 5.10.2023. poslana molba za žurnim donošenjem odluke na podnešeni zahtjev. Ugovor o osnivanju prava građenja potpisan 8.5.2024.
PRETOVARNA STANICA POŽEGA	10.3.2023. predani zahtjevi za sklapanjem Ugovora o pravu građenja. Zahtjev uredan i kompletiran. Čeka se odluka Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.	10.3.2023. predani zahtjevi za sklapanjem Ugovora o pravu građenja. Zahtjev uredan i kompletiran. Čeka se odluka Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
PRETOVARNA STANICA PAKRAC		10.3.2023. predani zahtjevi za sklapanjem Ugovora o pravu građenja. Ugovor o pravu građenje potpisan 12.12.2023. s Ministarstvom poljoprivrede
PRETOVARNA STANICA KUTINA	Za 2 od 7 katastarskih čestica za PS Kutina u vlasništvu Republike Hrvatske 7.4.2023. predan zahtjev za sklapanjem Ugovora o pravu građenja. Zahtjev uredan i kompletiran. Čeka se odluka Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.	Za 5 od 7 katastarskih čestica u vlasništvu komunalnog društva Eko-Moslavine Ugovor o pravu građenja potpisan 18.01.2023. Za 2 od 7 katastarskih čestica u vlasništvu Republike Hrvatske 7.4.2023. predan zahtjev za sklapanjem Ugovora o pravu građenja. Zahtjev uredan i kompletiran. Čeka se odluka Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
PRETOVARNA STANICA NOVSKA		10.3.2023. predani zahtjevi za sklapanjem Ugovora o pravu građenja. Ugovor o pravu građenje potpisan 01.12.2023. s Ministarstvom poljoprivrede

PRETOVARNA STANICA SISAK	Po dobivanju lokacijske dozvole pristupiti sklapanju ugovora o pravu građenja za lokaciju PS s gradom Siskom i GOS d.o.o. Prije izdavanja lokacijske dozvole potpisati ugovor o pravu služnosti za odvodnju pročišćene oborinske vode s gradom Siskom.	Po dobivanju lokacijske dozvole pristupiti sklapanju ugovora o pravu građenja za lokaciju PS s gradom Siskom i GOS d.o.o. Prije izdavanja lokacijske dozvole potpisati ugovor o pravu služnosti za odvodnju pročišćene oborinske vode s gradom Siskom.
PRETOVARNA STANICA VIROVITICA	Po dobivanju lokacijske dozvole pristupiti sklapanju ugovora o pravu građenja za lokaciju PS s gradom Viroviticom.	Po dobivanju lokacijske dozvole pristupiti sklapanju ugovora o pravu građenja za lokaciju PS s gradom Viroviticom.

Ostale aktivnosti :

- Kontinuirana suradnja i dogovori s jedinicama lokalne samouprave i komunalnim društvima o svim aktivnostima vezanim uz gospodarenje otpadom
- Organizacija redovnih Skupština Društva
- Izrada i usvajanje Plana rada i Financijskog plana te Izvješća o radu
- Informiranje putem web stranice o svim relevantnim događajima u svezi s uspostavom cjelovitog sustava gospodarenja otpadom te događajima vezanim uz provođenje projekata RCGO Šagulje
- Provedba edukativno-informativnih aktivnosti o Projektima i sustavu gospodarenja otpadom
- Sudjelovanje u radu i vođenje Grupacije centara za gospodarenje otpadom
- kontinuirana edukacija i usavršavanje znanja i vještina u području gospodarenja otpadom



4. FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

Prihodi i rashodi za 2025. godinu planirani su u iznosu od 79.299.870,54 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 63.029.576 eura, a podijeljene su na slijedeći način:

- Iznos od 76.289,89 eur odnosi se na 90% financiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponske elektrane na području RCGO Šagulje. Ukupna investicija je 201.075,05 eur.
- Ukupna investicija za gradnju pet pretovarnih stanica koja će se financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti iznosi **11.670.503 eur**, a u 2025. godini planira se potrošiti 2.187.500,00 eur.
- Ukupna investicija za gradnju RCGO Šagulje i dvije pretovarne stanice iznosi: 73.968.664 eur. U 2025. godini planira se raspisivanje natječaja za gradnju RCGO Šagulje u procijenjenom iznosu od 66.609.978 eur, za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC inženjera za projekt izgradnje RCGO Šagulje u iznosu: 1.579.400 eur, za usluge stručnog nadzora nad izgradnjom 2/7 pretovarnih stanica u iznosu: 132.536 eur, za izgradnju 2/7 pretovarnih stanica u iznosu od 4.400.000 eur te promidžba i vidljivost projekta u iznosu od 325.000 eur.
Nabrojane investicije planiraju se financirati iz EU sredstava, iz budućeg operativnog programa u omjerima: 63,76% - EU, 16,24% - RH i 20% - vlastito učešće.
- Ukupna investicija za gradnju odlagališta neopasnog i inertnog otpada iznosi: 3.267.150 eur, a u 2025. godini planira se raspisati natječaj za gradnju. Planira se sufinanciranje izgradnje oba odlagališta od FZOEU u iznosu od 70%.

Za vlastito učešće u financiranju navedenih investicija, u ukupnom iznosu od 15.873.277,80 eur, planira se zaduživanje kod najpovoljnije kreditne institucije.

Temeljem CBA analize, za kreditno zaduženje planiran je početak od 5 godina.

Prihodi od osnivača planirani su u ukupnom iznosu od 397.016,65 eur, od toga:

- Brodsko-posavska županija = 202.478,49 eur
- Požeško-slavonska županija = 97.269,08 eur
- Sisačko-moslavačka županija = 97.269,08 eur



Tablica 1.: Plan prihoda Društva za 2025. godinu, s projekcijama za 2026. i 2027. godinu

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
6			Prihodi poslovanja	644.064	13.737.942	79.299.871	13.141.757	7.699.245
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	323.121	13.059.360	78.902.854	12.762.907	7.332.395
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	277.218	693.977	397.017	378.850	366.850
8			Primitci od financijske imovine i zaduživanja		1.336.400	15.873.278	6.038.915	951.845
	84		Primitci od zaduživanja		1.336.400	15.873.278	6.038.915	951.845

Prihodi su planirani sukladno Ugovorima potpisanim s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, obvezama Osnivača, te analizi troškova i koristi koja je sastavni dio Studije izvedivosti Projekta.

Tablica 2.: Plan rashoda Društva za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3			Rashodi poslovanja	896.727	2.599.674	2.995.743	1.385.094	2.692.245
	31		Rashodi za zaposlene	95.744	105.000	138.000	158.000	158.000
	32		Materijalni rashodi	895.539	2.493.174	2.856.243	1.255.594	2.690.745
	34		Financijski rashodi	1.187	1.500	1.500	1.500	1.500
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.610	11.153.663	76.304.128	11.756.663	5.007.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.610	11.153.663	76.284.128	11.756.663	5.007.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	20.000	0	0

Plan rashoda izrađen je sukladno planu prihoda, a prema realiziranom u 2024. godini.

Predsjednik Uprave
Josip Grgić, dipl.ing.stroj.




REGIONALNI CENTAR ZA
GOSPODARENJE OTPADOM
ŠAGULJE
d.o.o.
TRG POBJEDE 26A, SLAVONSKI BROD

Tablica 2.: Plan rashoda Društva za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3			Rashodi poslovanja	896.727	2.599.674	2.995.743	1.385.094	2.692.245
	31		Rashodi za zaposlene	95.744	105.000	138.000	158.000	158.000
	32		Materijalni rashodi	895.539	2.493.174	2.856.243	1.255.594	2.690.745
	34		Financijski rashodi	1.187	1.500	1.500	1.500	1.500
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.610	11.153.663	76.304.128	11.756.663	5.007.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.610	11.153.663	76.284.128	11.756.663	5.007.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	20.000	0	0

Plan rashoda izrađen je sukladno planu prihoda, a prema realiziranom u 2024. godini.

Predsjednik Uprave
Josip Grgić, dipl.ing.stroj.

REGIONALNI CENTAR ZA
GOSPODARENJE OTPADOM
ŠAGULJE
TRG POBJEDE 26A, SLAVONSKI BROD
