

REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE
OTPADOM – ŠAGULJE d.o.o.
35 000 SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 26a

KLASA: 024-02/25-1/05
URBROJ: 2178-01-33-25-3
Slavonski Brod, 09. prosinca 2025.

Na temelju čl.4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva Regionalni centar za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o., članovi Nadzornog odbora Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. na svojoj sjednici održanoj dana 09.12.2025. godine donijeli su sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Plan rada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 2026. godinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora

Olivera Maglić, dipl.ing.stroj



Dostaviti:

- Članovima Nadzornog odbora
- Josip Grgić, predsjednik Uprave
- Arhiva
- Računovodstvo RCGO Šagulje d.o.o.

PLAN RADA REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM ŠAGULJE d.o.o. ZA 2026. GODINU



Slavonski Brod, studeni 2025.



Sadržaj

| | |
|--|----|
| 1. UVOD | 4 |
| 1.1. OPIS DJELATNOSTI | 5 |
| 2. REKAPITULACIJA UČINJENOG U 2025. GODINI | 7 |
| 3. CILJEVI I PLAN AKTIVNOSTI ZA 2026. GODINU | 10 |
| 4. FINACIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU | 14 |
| 5. ČIMBENICI RIZIKA | 16 |

POPIS KRATICA:

| Kratika: | Značenje: |
|----------|---|
| RCGO | Regionalni centar za gospodarenje otpadom |
| NKD | Nacionalna klasifikacija djelatnosti |
| NN | Narodne novine |
| RH | Republika Hrvatska |
| CGO | Centar za gospodarenje otpadom |
| PDV | Porez na dodanu vrijednost |
| ZGO | Zakon o gospodarenju otpadom |
| BPŽ | Brodsko-posavska županija |
| PSŽ | Požeško-slavonska županija |
| SMŽ | Sisačko-moslavačka županija |
| VPŽ | Virovitičko-podravska županija |
| MZOZT | Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije |
| FZOEU | Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost |
| EU | Europska unija |

1. UVOD

Trgovačko društvo Centar za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije osnovano je 21.12.2010. godine. Doregistrirano je 04.12.2017. godine u **REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM ŠAGULJE d.o.o.**

U vlasništvu je triju županija: Brodsko-posavske (51%), Požeško-slavonske (24,5%) i Sisačko-moslavačke (24,5%) a cilj osnivanja je da organizira izgradnju te potom upravlja radom RCGO Šagulje u Novoj Gradiški.


Društvo je osnovano kako bi se uspostavio sustav gospodarenja otpadom Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke i Virovitičko-podravске županije, a sve sukladno Strategiji i Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Osoba ovlaštena za zastupanje društva je predsjednik Uprave Josip Grgić, dipl.ing.stroj.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Obuhvat samog projekta prostire se na četiri županije, i to: dio Sisačko-moslavačke, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku i Virovitičko podravsku županiju.

Slika 1: Obuhvat RCGO Šagulje

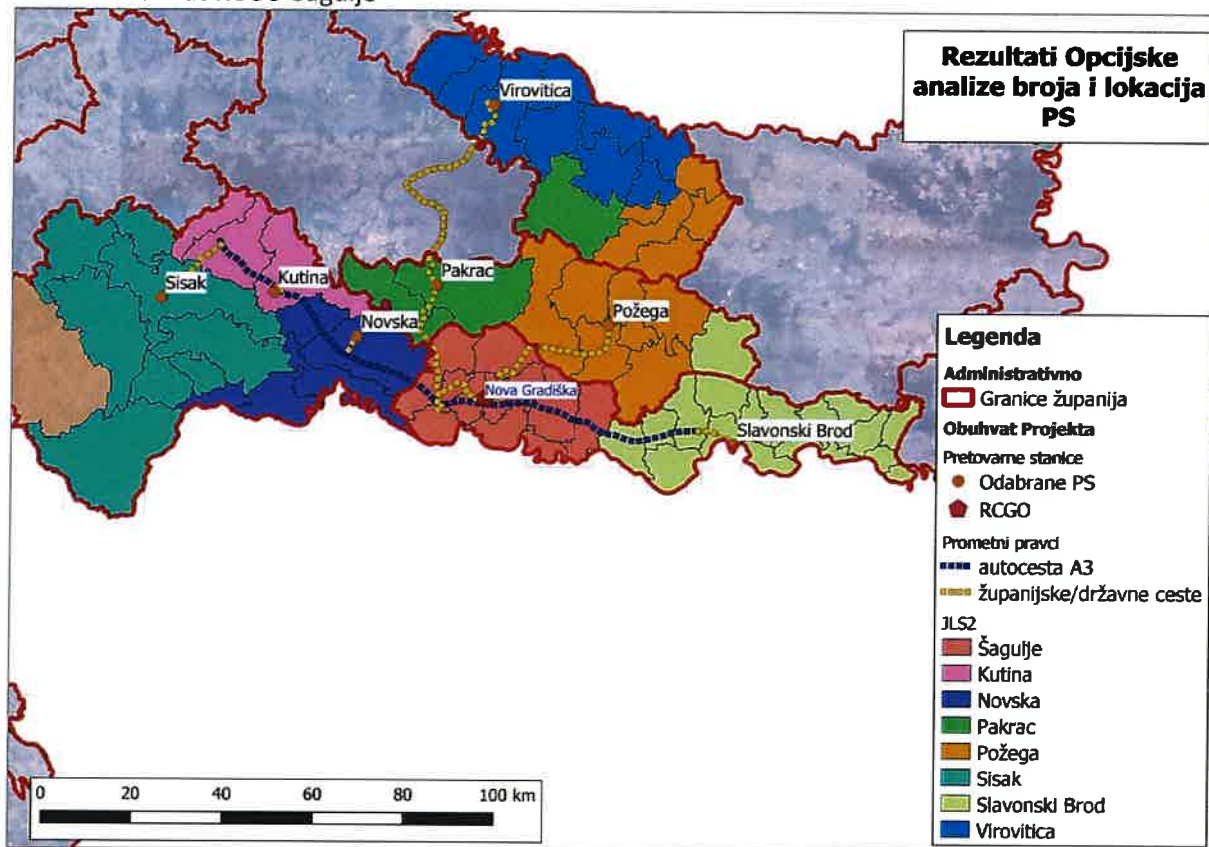


Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, prema RCGO Šagulje gravitirat će **406.411 stanovnik.**

1.1. Opis djelatnosti

Osnovna djelatnost RCGO Šagulje d.o.o. je gospodarenje otpadom.

Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj, Sisačko-moslavačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji osnovu nalazi u Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021, 142/23), u Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) za razdoblje 2005. do 2025. i u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2023.-2028. (NN 84/2023).

Slika 2: Obuhvat poslovanja RCGO Šagulje

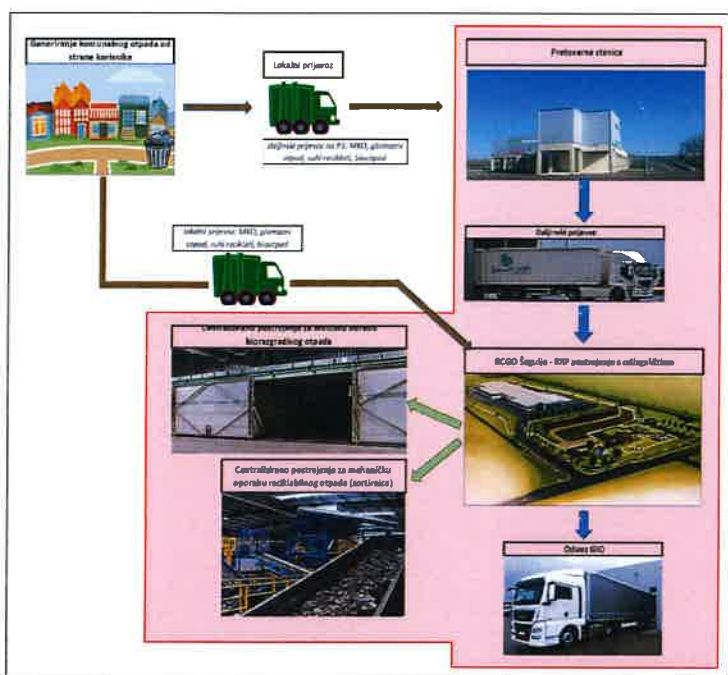

Djelatnost komunalnih tvrtki:

- Prikupljanje komunalnog otpada te transport na RCGO ili PS
- Naplata cjelovite usluge prema korisnicima

Djelatnost Šagulje d.o.o.:

- Daljinski transport na relaciji RCGO-PS
- Obrada zaprimljenog komunalnog otpada u sklopu RRF postrojenja (MKO, glomazni otpad, suhi reciklati – papir/karton, plastika, metali, biootpad)
- Zbrinjavanje izlaznih frakcija (GIO, sortirane frakcije, kompost, stabilat)
- Obrada te odlaganje građevnog i neopasnog proizvodnog otpada
- Naplata izvršene usluge prema komunalnim društvima

Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje zajedno sa pretovarnim stanicama predstavlja važan dio tog sustava koji se mora uspostaviti na regionalnoj razini, a koja će uspostava doprinijeti ispunjenju ciljeva iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6.1 – Smanjena količina otpada koji se odlaze na odlagališta, Plana gospodarenja otpadom RH 2023.-2028. i Zakona o gospodarenju otpadom, na razini RH.

Centar za gospodarenje otpadom je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada, te je kao takav građevina za gospodarenje otpadom od državnog značaja prema članku 12. stavku 1. Zakona o gospodarenju otpadom.

Pretovarna stanica je građevina za privremeno skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove uporabe ili zbrinjavanja, odnosno u CGO.

Sukladno članku 10. Zakona o gospodarenju otpadom, gospodarenje otpadom i građenje građevina za gospodarenje otpadom od interesa su za Republiku Hrvatsku.

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i Planu gospodarenja otpadom RH jedinice lokalne samouprave su u obvezi, u sklopu javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (čl. 64. Zakona), osigurati uslugu prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge:

1. miješanog komunalnog otpada
2. biootpada
3. reciklabilnog komunalnog otpada i
4. glomaznog otpada jednom godišnje te
 - uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu
 - uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi.

CGO je, prije svega, postrojenje za obradu miješanog komunalnog otpada i njegova zakonska obveza je preuzimanje i obrada miješanog komunalnog otpada (ZGO čl. 13. st.3) dok su za druge tokove otpada zadužene jedinice lokalne samouprave (papir, plastika, staklo, metal, tekstil, građevinski otpad, odvojeno prikupljeni biootpad).

CGO može prihvaćati, osim miješanog komunalnog otpada, i druge vrste komunalnog otpada, što je potrebno regulirati sporazumom (čl. 13. ZGO).



2. REKAPITULACIJA UČINJENOG U 2025. GODINI

2.1. Realizacija projekta izgradnje pretovarnih stanica na obuhvatu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje

U tijeku je provedba Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost – za projekt: „Izgradnja pretovarnih stanica na obuhvatu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje“

Bespovratna sredstva za projekt izgradnje pretovarnih stanica na obuhvatu RCGO Šagulje ishođena su u prosincu 2024. godine iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 12.855.602,56 eur, a dodijeljena su bespovratna sredstva u visini 70% prihvatljivih troškova projekta iz sredstava NPOO te u visini 15% prihvatljivih troškova projekta iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Preostalih 15% vrijednosti projekta snosi RCGO Šagulje.

U lipnju 2025. godine započela je izgradnja pet pretovarnih stanica, i to: pretovarna stanica SlavonSKI Brod, pretovarna stanica Kutina, pretovarna stanica Novska, pretovarna stanica Požeška i pretovarna stanica Pakrac.

U tijeku su radovi na izgradnji navedenih pretovarnih stanica a završetak radova planiran je do rujna 2026. godine.

2.2. Realizacija projekta izrade studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Šagulje

2.2.1. Okolišne procedure

- Ishođeno Rješenje o procjeni utjecaja na okoliš
- Ishođeno Rješenje ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (izmjena)
- Provedene procedure povezane s specifičnim ciljevima očuvanja područja ekološke mreže

2.2.2. Projektna dokumentacija

- Ishođena Lokacijska dozvola za RCGO
- Ishođena izmjena Lokacijske dozvole za RCGO
- Ishođeno 6 od 7 Građevinskih dozvola za pretovarne stanice
- Ishođene Građevinske dozvole za odlagalište neopasnog i odlagalište inertnog otpada
- Ishođena Potvrda na glavni projekt za fotonaponsku elektranu RCGO Šagulje

2.2.3. Natječajna dokumentacija

- Pripremljene Dokumentacije o nabavi za sve usluge i radove
- Proveden postupak nabave za radove izgradnje pet pretovarnih stanica u obuhvatu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje
- Pripremljena Dokumentacija o nabavi za izgradnju fotonaponske elektrane.

2.3. Financiranje Društva

Izrada studijsko-projektne dokumentacije

Razdoblje prihvatljivosti troškova financijskog razdoblja 2014. - 2020., iz kojega je projekt financiran, isteklo je 31.12.2023. godine te je bilo potrebno ugovoriti financiranje izrade preostale studijsko-projektne dokumentacije s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Izrada studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje financirala se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., a koji je trajao do 31.12.2023. godine.

Nakon proteka razdoblja financiranja, s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopljen je Ugovor o financiranju izrade preostale studijsko-projektne dokumentacije potrebne za prijavu Projekta Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje na EU sufinanciranje, davanjem kapitalne pomoći u visini 100% preostalog iznosa potrebnog za završetak izrade studijsko-projektne dokumentacije (245.276,95 eur).

Ugovor vrijedi do 30.06.2026. godine.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju odlagališta

Temeljem Ugovora o financiranju izrade dodatne dokumentacije potrebne za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje, davanjem kapitalne pomoći, broj: 2025/001935, od 09.08.2023. godine sklopljenog s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, na iznos: 200.000,00 eur, izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju odlagališta neopasnog i inertnog otpada.

Vrijednost usluge iznosila je 181.025,00 eur bez PDV, temeljem provedenog natječaja javne nabave. FZOEU je financirao uslugu u 100% iznosu, a preostali iznos od 24.500 eur realiziran je do kraja drugog kvartala 2025. godine.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za fotonaponsku elektranu RCGO Šagulje

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026., broj: C2.1.R2.I1.052, od 21.07.2023. godine, sklopljenim s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, na iznos 180.967,54 eur, sufinancira se izrada projektne tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponske elektrane snage 3 MW za potrebe RCGO Šagulje.

Prihvatljivi troškovi iznose: 201.075,05 eur

Bespovratna sredstva (90%) koja dodjeljuje MRRFEU iznose: 180.967,54 eur

Vlastita sredstva (10%): 20.107,51

Vrijednost usluge, temeljem provedenih natječaja javne nabave iznosila je: 111.566,54 eur bez PDV.

Sredstva su realizirana do kraja kolovoza 2025. godine.

Provedba projekta izgradnje pretovarnih stanica u obuhvatu RCGO Šagulje

U prosincu 2024. godine RCGO Šagulje je ishodilo bespovratna sredstva za financiranje izgradnje pet pretovarnih stanica u svom obuhvatu, a za koje su ishođene pravovaljane građevinske dozvole.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost, ref. broj: NPOO.C1.3.R2-I1.06.0002 sklopljen je dana 28.01.2025. godine.

Po provedenim postupcima nabave, sklopljeni su ugovori o izgradnji pretovarnih stanica te ugovor za nadzor nad izgradnjom i ugovor za upravljanje projektom izgradnje. U tijeku je provedba svih navedenih ugovora.

Tekuće poslovanje RCGO Šagulje

Sukladno Društvenom ugovoru, troškove rada RCGO Šagulje financiraju Osnivači razmjerno visini svojih udjela.

Troškovi tekućeg poslovanja tijekom 2025. godine planirani su na iznos: 378.977,90 eur, i to:

- Brodsko-posavska županija (51%) = 193.278,72 eur
- Požeško-slavonska županija (24,5%) = 92.849,59 eur
- Sisačko-moslavačka županija (24,5%) = 92.849,59 eur

2.4. Organizacija rada Društva

Dana 15. listopada 2024. godine Skupština Društva je na svojoj 21. Sjednici donijela Odluku o usvajanju Plana prihoda i rashoda Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 2025. godinu, a na temelju kojega se utvrđuje način financiranja Društva u skladu s planiranim troškovima poslovanja u 2025. godini.

Dana 24. listopada 2024. godine Nadzorni odbor Društva je na svojoj 16. Sjednici donio Odluku o usvajanju Plana rada Društva za 2025. godinu.

Do trenutka izrade ovoga Plana održane su 4 sjednice Skupštine Društva i 4 Sjedice Nadzornog odbora.

3. CILJEVI I PLAN AKTIVNOSTI ZA 2026. GODINU

Slika 3: Vizija i misija Društva



Vizija

Odgovorno upravljanje izgrađenom infrastrukturom za gospodarenje otpadom zasnovanom na najvišim standardima zaštite okoliša i ljudskog zdravlja i osiguravanje održivosti uspostavljenog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u BPŽ, PSŽ, SMŽ i VPŽ

Misija

Izgraditi infrastrukturu za gospodarenje otpadom na regionalnoj razini, centar za gospodarenje otpadom i pretovarne stanice. Osigurati da se gospodarenje otpadom primjenom najsuvremenijih tehnologija obrade otpada odvija uz maksimalnu zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja.

Osigurati pretpostavke da uspostavljeni sustav odgovara dugoročnim potrebama i mogućnostima stanovništva BPŽ, PSŽ, SMŽ i VPŽ te da jamči njegovu održivost.

Edukacijom dionika omogućiti postizanje ciljeva projekta. Upravljeti uspostavljenim sustavom na dobrobit današnjih i budućih generacija.

Temeljem naprijed iznesene rekapitulacije uĉinjenog u 2025. godini, utvrđuju se ciljevi i aktivnosti za 2026. godinu kako slijedi:

CILJ 1.: Osiguranje sredstava za realizaciju projekta i provođenje postupaka javne nabave

Dana 20. studenog 2025. godine Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 128. sjednici donijela Odluku o modelu financiranja novih projekata izgradnje Centara za gospodarenje otpadom u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i drugih instrumenata Europske Unije (KLASA: 022-03/25-04/465, URBROJ: 50301-05/31-25-6).

Planirane aktivnosti:

- Ishođenje Odluke o financiranju i sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava iz PKK 2021.-2027.
- Sklapanje Ugovora o davanju sredstava kapitalne pomoći FZOEU
- Sklapanje Ugovora o kreditiranju vlastitog uĉešća u projektu
- Provođenje postupaka javne nabave za radove i popratne usluge na izgradnji RCGO Šaĝulje i preostale dvije pretovarne stanice (Sisak i Virovitica)
- Provođenje postupaka javne nabave za radove i popratne usluge na izgradnji odlagališta neopasnog i inertnog otpada

| CILJ 1: Osiguranje sredstava za realizaciju projekta i provođenje postupaka javne nabave | 2026 | | | | | | | | | | | |
|---|------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Ishođenje Odluke o financiranju i sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava iz PKK 2021.-2027. | | | | | | | | | | | | |
| Sklapanje ugovora o davanju kapitalne pomoći FZOEU | | | | | | | | | | | | |
| Sklapanje Ugovora o kreditiranju vlastitog uĉešća u projektu | | | | | | | | | | | | |
| Provođenje postupaka javne nabave za radove i popratne usluge na izgradnji RCGO Šaĝulje i preostale dvije pretovarne stanice (Sisak i Virovitica) | | | | | | | | | | | | |
| Provođenje postupaka javne nabave za radove i popratne usluge na izgradnji odlagališta neopasnog i inertnog otpada | | | | | | | | | | | | |

Dokumentacija o nabavi za navedene predmete nabave je izrađena u sklopu Ugovora za izradu dokumentacije o nabavi radova, usuga i opreme za izgradnju RCGO Šaĝulje i pretovarnih stanica u svrhu sufinanciranja projekta sredstvima EU.

Dokumentacija o nabavi radova izgradnje odlagališta neopasnog i inertnog otpada izrađena je u sklopu Ugovora o uslugama izrade projektne dokumentacije Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šaĝulje – Odlagalište za neopasni otpad – Zona 7 i Odlagalište za inertni otpad – Zona 8.

CILJ 2.: Realizacija projekta RCGO Šaĝulje

U tijeku je projekt izgradnje pretovarnih stanica u obuhvatu RCGO Šaĝulje (PS Slavonski Brod, PS Požeĝa, PS Pakrac, PS Kutina, PS Novska), a za koje je završetak planiran u rujnu 2026. godine.

Po provođenju postupaka javne nabave izgradnje CGO i preostale dvije pretovarne stanice te odlagališta neopasnog i inertnog otpada, planira se ugovaranje nabavljenih radova te uvođenje u posao odabranih izvođača.

| CILJ 2: Realizacija projekta izgradnje RCGO Šagulje | 2026 | | | | | | | | | | | |
|--|------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Izgradnja pretovarnih stanica u obuhvatu RCGO Šagulje | | | | | | | | | | | | |
| Provođenje usluga stručnog nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica u obuhvatu RCGO Šagulje | | | | | | | | | | | | |
| Provođenje usluga voditelja projekta "Izgradnja pretovarnih stanica u obuhvatu RCGO Šagulje" | | | | | | | | | | | | |
| Praćenje i administriranje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz NPOO | | | | | | | | | | | | |
| Ishođenje Uporabnih dozvola za izgrađene građevine | | | | | | | | | | | | |
| Ugovaranje i početak radova izgradnje RCGO Šagulje i 2 pretovarne stanice (Sisak i Virovitica) | | | | | | | | | | | | |
| Ugovaranje i početak radova izgradnje odlagališta neopasnog i inertnog otpada | | | | | | | | | | | | |

CILJ 3.: Riješeni imovinsko-pravni odnosi

Aktivnosti vezane uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s Republikom Hrvatskom u tijeku su za Centar i pretovarne stanice Požega, Kutina i Sisak.

| CILJ 3: Riješeni imovinsko-pravni odnosi | 2026 | kompletna kronologija |
|--|---|--|
| | OPIS AKTIVNOSTI | OPIS AKTIVNOSTI |
| RCGO ŠAGULJE | 10.3.2023. predani zahtjevi za sklapanjem Ugovora o pravu građenja. Zahtjev uredan i kompletiran. Čeka se odluka Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. | U tijeku je ugovaranje darovanja zemljišta od strane Republike Hrvatske za centralni prostor u k.o. Mašić i k.o. Kovačevac, Nova Gradiška. Prije potpisivanja Ugovora potrebno je ishoditi suglasnost Skupštine Društva. |



| | | |
|------------------------------|---|---|
| PRETOVARNA STANICA POŽEGA | 10.3.2023. predani zahtjevi za sklapanjem Ugovora o pravu građenja. Zahtjev uredan i kompletiran. Čeka se odluka Ministarstva poljoprivrede i potpis Ugovora. | U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u Ministarstvu poljoprivrede. Zbog dugotrajnog postupka, zahtjev je više puta nadopunjavao. U 2026. godini planira se završetak postupka. |
| PRETOVARNA STANICA KUTINA | Za 5 katastarskih čestica koje su u vlasništvu komunalnog društva Eko moslavina d.o.o. sklopljen je ugovor o pravu građenja, a za preostale dvije koje su u vlasništvu Republike Hrvatske dana 7.4.2023. godine predan je zahtjev za sklapanjem Ugovora o pravu građenja. Zahtjev uredan i kompletiran. Čeka se odluka Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. | U tijeku je postupak ugovaranja darovanja zemljišta za česticu k.č. 9684, k.o. Kutina. Potrebno je izvršiti spajanje čestica iz razloga što su različiti vlasnici. |
| PRETOVARNA STANICA SISAK | 10.03.2025. predan je zahtjev za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa Gradom Siskom i tvrtkom GOS d.o.o. | Upućeni su dopisi i zahtjevi Gradu Sisku za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. U 2026. godini planira se ishoditi ugovor o darovanju ili pravu građenja za zemljište za PS Sisak. |

Ostale aktivnosti :

- Implementacija i priprema za certifikaciju integriranih sustava upravljanja (upravljanje dokumentacijom, sustav zaštite okoliša, sustav zaštite za radu – ISO 9001, 14001);
- Kontinuirana suradnja i dogovori s jedinicama lokalne samouprave i komunalnim društvima o svim aktivnostima vezanim uz gospodarenje otpadom;
- Organizacija redovnih Skupština Društva
- Izrada i usvajanje Plana rada i Financijskog plana te Izvješća o radu
- Informiranje putem web stranice o svim relevantnim događajima u svezi s uspostavom cjelovitog sustava gospodarenja otpadom te događajima vezanim uz provođenje projekata RCGO Šagulje
- Provedba edukativno-informativnih aktivnosti o Projektima i sustavu gospodarenja otpadom
- Sudjelovanje u radu i vođenju Grupacije centara za gospodarenje otpadom
- kontinuirana edukacija i usavršavanje znanja i vještina u području gospodarenja otpadom

4. FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU

Prihodi i rashodi za 2026. godinu planirani su u iznosu od 15.686.455,36 eura.

1. Temeljem Ugovora o financiranju preostale studijsko-projektne dokumentacije potrebne za prijavu Projekta Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje na EU sufinanciranje, davanjem kapitalne pomoći, broj: 2024/025688, od 31.10.2024. godine sklopljenog s Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, na iznos: 245.276,95 eur, financira se preostala studijsko-projektna dokumentacija koja je bila predmet sufinanciranja u OPKK 2014.-2020. Nakon završetka OPKK, 31.12.2023., sklopljen je Ugovor s FZOEU, i to u 100% iznosu vrijednosti preostale dokumentacije.

Do kraja 2026. godine preostaje za realizaciju **14.263,64 eur**.

2. Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost, broj: NPOO.C1.3.R2-11.06.0002, od 28.01.2025. godine, sklopljenim s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, sufinancira se izgradnja pet pretovarnih stanica na obuhvatu RCGO Šagulje.

Ukupna vrijednost Projekta: 12.855.602,56 eur

Prihvatljivi troškovi: 12.855.092,91 eur

Bespovratna sredstva (70%): 8.998.565,03 eur

Bespovratna sredstva FZOEU (15%): 1.928.263,94

Do kraja 2026. godine preostaje za realizaciju:

- MZOZT: 7.081.427,00 eur
- FZOEU: 1.510.139,72 eur
- Vlastito učešće: 1.450.000,00 eur

Iznos vlastitih sredstava za 2026. godinu: 1.450.000,00 eur raspoređen je sukladno osnivačkim udjelima Osnivača, i to:

Brodsko-posavska županija (51%): 739.500,00 eur

Požeško-slavonska županija (24,5%): 355.250,00 eur

Sisačko-moslavačka županija (24,5%): 355.250,00 eur

te je navedene iznose potrebno uvrstiti u proračune Županija.

3. Ukupna investicija u izgradnju i opremanje RCGO Šagulje i preostale dvije pretovarne stanice, prema zadnjim podacima iz CBA, iznosi: 106.144.311,00 eur.

Raspored investicije i izvori financiranja za slijedeće trogodišnje razdoblje daju se u slijedećoj tablici:

| RB | UGOVOR/KOMPONENTA | UKUPNO | 2026. | 2027. | 2028. |
|----|---|---------------------|------------|------------|------------|
| 1. | Upravljanje projektom - djelatnici | 369.600,00 | 123.200,00 | 123.200,00 | 123.200,00 |
| 2. | Upravljanje projektom - vanjski stručnjaci | 885.350,00 | 179.740,00 | 359.480,00 | 346.130,00 |
| 3. | Nadzor nad projektiranjem i izgradnjom RCGO | 1.571.495,00 | | 628.598,00 | 942.897,00 |
| 4. | Nadzor nad izgradnjom 2/7 pretovarnih stanica | 224.275,00 | | 89.710,00 | 134.565,00 |
| 5. | Troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 6. | Troškovi pristojbi/doprinosa za potrebe ishoda akata gradnje, početka i završetka gradnje | 940.000,00 | 940.000,00 | | |

| | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 7. | Projektiranje i izgradnja RCGO Šagulje | 73.478.852,00 | 2.873.610,00 | 16.419.936,40 | 54.185.305,60 |
| 8. | Izgradnja 2/7 pretovarnih stanica | 4.550.000,00 | 800.000,00 | 2.000.000,00 | 1.750.000,00 |
| 9. | Oprema za daljinski prijevoz: | 8.195.000,00 | | | |
| | Nabava vozila: | 560.000,00 | | | |
| 9. | Neprihvatljivi trošak: nabava mob.drobnice: | | | | 8.755.000,00 |
| 10. | Promidžba i vidljivost | 325.000,00 | | 175.000,00 | 150.000,00 |
| 11. | Nepredviđeni troškovi prihvatljivih troškova izgradnje CGO i 2 PS | 14.894.739,00 | | 5.980.658,40 | 8.914.080,60 |
| UKUPNO: | | 106.144.311,00 | 5.066.550,00 | 25.776.582,80 | 75.301.178,20 |

IZVORI FINANCIRANJA

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| EU RAZINA (60,00%) | 63.350.586,60 | 3.039.930,00 | 15.465.949,68 | 44.844.706,92 | |
| DRŽAVNA RAZINA (23,00%) | 24.284.391,53 | 1.165.306,50 | 5.928.614,04 | 17.190.470,99 | |
| LOKALNA RAZINA (17%) | 18.509.332,87 | 861.313,50 | 4.382.019,08 | 13.266.000,29 | |
| | <i>BPŽ</i> | 9.439.759,76 | 439.269,89 | 2.234.829,73 | 6.765.660,15 |
| | <i>PSŽ</i> | 4.534.786,55 | 211.021,81 | 1.073.594,67 | 3.250.170,07 |
| | <i>SMŽ</i> | 4.534.786,55 | 211.021,81 | 1.073.594,67 | 3.250.170,07 |

4. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – prihodi od Osnivača za tekuće poslovanje: 564.075,00 eur
- Brodsko-posavska županija (51%): 287.678,24 eur
 - Požeško-slavonska županija (24,5%): 138.198,38 eur
 - Sisačko-moslavačka županija (24,5%): 138.198,38 eur

5. ČIMBENICI RIZIKA

U nastavku se daju predviđanja rizičnih čimbenika u pojedinim segmentima poslovanja, a koji mogu utjecati na pravodobnu i točnu realizaciju planiranih aktivnosti i financijskih veličina predviđenih za njihovo izvršenje.

5.1. Kašnjenje uslijed neizvršavanja obveza Izvođača

Utjecaj ovog rizičnog događaja može biti značajan, s obzirom da je riječ o EU sufinanciranim projektima. Ugovor o izvođenju radova dodijeljen je Izvođačima koji imaju bogato iskustvo u izvođenju građevinskih radova. Također, Izvođač je Naručitelju dostavio Jamstvo za uredno izvršenje Ugovora, kojim jamči za pravovremenu i kvalitetnu izvedbu te se stoga smatra kako je vjerojatnost nastanka ovog događaja mala. U sklopu ovog projekta ugovorene su i usluge stručnog nadzora siskusnom tvrtkom. Inženjer je zadužen za redovno praćenje ugovora o radovima i izvršenja obveza izvođača. Uz inženjera, provedbu projekta prarti i Voditelj projekta i njegov tim te će pravovremeno upozoravati Naručitelja na eventualne prepreke urednoj provedbi Projekta.

5.2. Financijske korekcije

Rizik je značajan u dijelu pravovremenog osiguranja sredstava za potencijalne financijske korekcije, a kako se ne bi ugrozilo financiranje projekta, odnosno ugovorena valuta plaćanja. Društvo će poduzeti sve potrebne korake kako ne bi došlo do korekcija, no različito tumačenje određenih situacija od strane nadležnih tijela može dovesti do korekcija. Stoga je potrebno uskladiti postupanja Provedbenih tijela i Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave koje su često kontradiktorne, što uzrokuje izricanje nekonzistentnih i paušalnih financijskih korekcija provoditeljima projekta čime se dodatno smanjuju dostupna bespovratna sredstva.

5.3. Neredovite uplate po Zahtjevima za nadoknadom sredstava i članova Društva

Potrebno je redovito i ažurno plaćanje od strane PT, FZOEU te svih članova Društva. U protivnom, Društvo neće biti u mogućnosti izvršiti svoje ugovorne obveze što za posljedicu može imati plaćanje ugovorne kazne, a u težim slučajevima dovesti i do raskida ugovora i plaćanja naknade štete.

Predsjednik Uprave
Josip Grgić, dipl.ing.stroj.
